



Ing. José Fernando Zurita Caicedo

Barrio Aeropuerto #2 - Tena
Tlf: 062310829 - 09 87828120

33
Avance
100

Tena, 30 de octubre de 2019

Oficio No. JFZC-FGPN-0005-2019

INGENIERO MANUEL GUAPULEMA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
GAD PROVINCIAL DE NAPO

Ref.: Contrato de Fiscalización de la Obra:
AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE
RÍO PUSUNO - SAN SILVERIO - AHUANO,
(SEGUNDA ETAPA), TRAMO: KM 14+360 - KM
15+660, PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA,
PROVINCIA DE NAPO.

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO ZURITA

Asunto: APROBACIÓN DE REPROGRAMACIÓN

Reciba un cordial saludo, mediante el presente pongo en conocimiento que se ha revisado con detenimiento el oficio No. 086-1-2019-AC-AHUANO-GADPN con fecha 28 de octubre de 2019, el cual solicita la revisión de la reprogramación correspondiente al contrato "Ampliación y Asfaltado de la Vía Río Pusuno-San Silverio-Ahuano. (Segunda Etapa) Tramo: km 14+360-km 15+660".

Una vez revisada la documentación entregada concerniente a la reprogramación del cronograma valorado de trabajos, informo que luego del análisis técnico es procedente la aprobación del mismo por parte de la fiscalización; para que se continúe con los trabajos y la legalización de la reprogramación por parte del Administración del Contrato.

Por la atención que se sirva dar a la presente quedo de Usted agradecido.

Atentamente


Ing. Fernando Zurita
FISCALIZADOR CONTRATADO

FERNANDO ZURITA CAICEDO
INGENIERO CIVIL
TENA ECUADOR
R.U.C. 1500624661001

RECIBIDO
30-10-2019
16:00
(2)

APPROBADO
11/10/2019



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**

Oficio No.- 086 -1 – AC – AHUANO - GADPN

Tena, 28 de octubre de 2019

Ingeniero

José Fernando Zurita Caicedo

CONTRATISTA CONSULTOR DE LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

**AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE RÍO PUSUNO – SAN SILVERIO
– AHUANO (II ETAPA), TRAMO KM 14+360 A KM 15+660, PARROQUIA AHUANO,
CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.**

Presente.-

En atención al oficio BHC-GN-003 del 28 de octubre de 2019, mediante el cual se remite la reprogramación correspondiente al contrato **"AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE RÍO PUSUNO – SAN SILVERIO – AHUANO (II ETAPA), TRAMO KM 14+360 A KM 15+660, PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO"**, solicito a usted, realizar la respectiva revisión y aprobación de lo antes mencionado y así continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente.

Ing. Civil Manuel Guapulema Guaraca
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Recibido
28-10-2019
17:00




PROYECTO: AMPLIACIÓN Y ASISTADO DE LA VÍA PLENIE RÍO PLEISNO. SAN SILVERIO. MATANZO, SECCIÓN-A ETAPPA. FRASHE KM 14-3500. KM 13-1600. PARROQUIA SIENNA, CANTÓN TESA, PROVINCIA DE NAPO.

REFERENCIAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
4	REPRESENTACION Y MOVIL. AEREA (OTRA)	\$/m	1.00	650.00	650.00
					826.00

2	DESHEROCE, DESINCRUSTE Y LIMPIEZA	410	1.30	624.86	812.3180
3	ENCAVACION EN SUELO	m2	5.725,00	2.48	12.216,800000
4	ENCAVACION EN MATERIAL	m3	2.527,00	3.31	9.612,630000
5	ENCAVACION EN BOCA	m3	128,00	16,65	2.128,800000
6	REPARACION DE FORTES DE TUBERACION EXTERIORES	m	3,60	647,57	1.442,716000
7	REPARACION DE SUPERFICIE CON SUELO MELOCOMADO	m2	5,676,88	7,25	36.793,750000
8	GEOMALLA MAXIAL	m2	2.800,00	3,19	80.481,000000
9	CIOTEXTIL NO TEJIDO	m2	7.869,00	2,32	18.096,000000
10	SUBBASE CLASE 3 (NOCTIVE TRANSPORTES)	m3	3.656,00	7,135	44.284,900000
11	BASE CLASE 2 (NOCTIVE TRANSPORTES)	m3	1.465,00	19,25	28.347,750000
12	ASEFALTO RC 250 PARA IMPERMEABILIZACION (150 LBS/M2)	l	10.920,00	1,06	11.572,000000
13	CAPA DE REJUNADURA HERRADURA ANILATICO E-5 CM	m2	8.198,00	16,73	97.714,080000
14	ENCAVACION Y REJUNADO PARA ESTRUCTURAS ACEROS	m3	256,00	6,04	1.589,666000
15	REJUNADURA METAL (CORRUGADO) D=1,30 CM	m	43,40	39,667	1.133,251000
16	REJUNADURA CLASE B CAHEZALTS (6-210 KG/CAL)	m3	23,40	217,26	7.694,100000
17	ENCAVACION PARA CUBIERTAS CALDERAS Y BOCANAS ACEROS	m3	720,00	3,78	2.190,000000
18	DEBILITAMIENTO DE ALEROS DE ALA	m3	2,30	27,44	63,112000
19	HERRADURA Y ANILATICO PARA ALEROS Y CALDERAS	m3	839,00	12,557	90.294,120000

11 oct al 13 oct	1 mes	1.30000	850.97790	1.30000	812.34000
03 oct al 10 oct	26 sept al 03 oct	suspensión de trabajos desde 03 de octubre hasta el 13 de octubre por paro nacional			

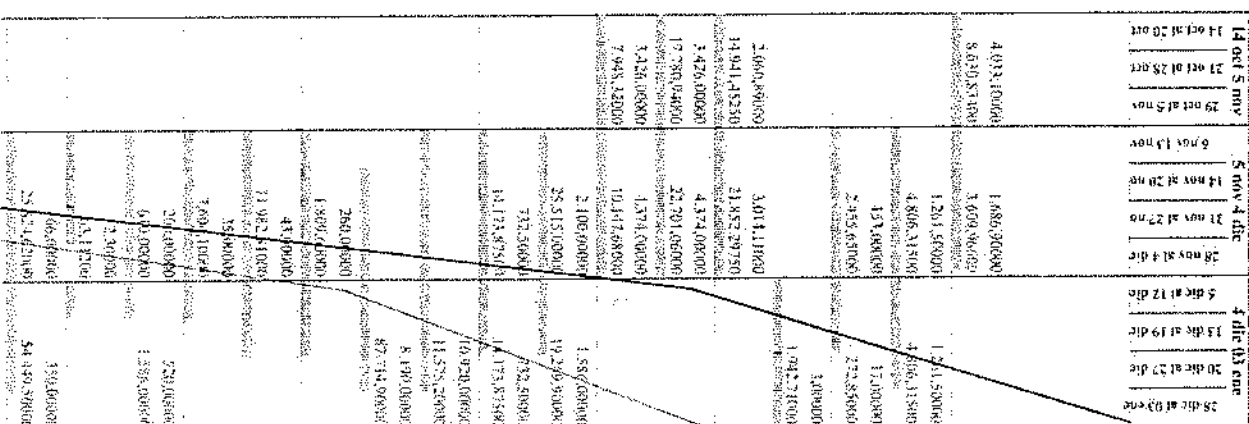

21	LINIA DE BORDE CARRIL (Variable o fijo) BLANCA	m	2 600,00	0,56	1 456,00000	2 600,00000
22	SIGNALES PREVIATIVAS Y REGLAMENTARIAS (0,75 X 0,75 M)	u	15,00	172,71	2 590,65000	1 456,00000
23	MARCAS SOBRESALIDAS DE DE PAVIMENTO (bidireccional)	u	108,00	5,94	641,52000	15,00000
24	MARCAS SOBRESALIDAS DE PAVIMENTO (bidireccional)	u	217,00	5,94	1 288,98000	308,00000
25	SIGNALES DE INICIO DE PROYECTO (Tipo Tonne)	u	1,00	1 948,45	1 948,45000	641,52000
26	SEÑAL RESTRICTIVA DE PARE (0,75 X 0,75 M)	u	2,00	172,14	344,28000	217,00000
27	SEÑAL RESTRICTIVAS DE VELOCIDAD MAXIMA (0,75 M)	u	2,00	171,51	343,02000	1 288,98000
28	SIGNALES INFORMATIVAS (1,20 X 0,60 M)	u	1,00	272,31	272,31000	1 948,45000
29	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m ³	500,00	1,45	725,00000	1,00000
30	INSTRUCTIVOS O TRIPITICOS	u	120,00	1,06	127,20000	272,31000
31	CHARTAS DE ABLESTRAMIENTO	u	2,00	228,00	456,00000	1,00000
32	TRABAJOS DE ENLAZADO ENTRE SUPERFICIES RIGIDAS Y FLEXIBLES	u	2,00	228,00	456,00000	272,31000
33	COMUNICADOS RAJUALES	u	20,00	7,20	144,00000	1,00000
34	SIGLA BLANCAS (1,10 X 0,60 M) X (1,20 M)	u	4,00	5,31	21,24000	2,00000
35	SIGNALES DE HOMBRIS TRABAJANDO (0,60 X 1,20 M)	u	2,00	227,83	455,66000	14,40000
36	USO MUEBLES DE SUSPENSIÓN Y PAVIMENTO PASADIZO	m ³	7 000,00	1,20	8 400,00000	1,00000
37	ROLLO DE CINTA REFLECTIVA	u	1,00	22,51	22,51000	227,83000
38	UTILES AMBIENTALES DEL PROYECTO (0,60 X 1,20 M)	u	1,00	272,31	272,31000	8 400,00000
INVERSION MENSUAL					421 102,65700	
AVANCE MENSUAL (%)						
INVERSION ACUMULADA AL 100% (línea e-1p)						
AVANCE ACUMULADO (%)						
INVERSION ACUMULADA AL 80% (línea e-0.5p)						
AVANCE ACUMULADO (%)						
PLAZO TOTAL=90 DIAS						

55,814,103.50	157,107,605.50	203,287,822.00
13.25	37.31	48.28
55,814,103.50	212,921,709.00	416,209,531.00
13.25	50.56	100.00
44,651,282.80	170,337,367.20	332,967,624.80
10.60	40.45	80.00


 ING. MAXI EL GUAPULEMA
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO


 ING. FERNANDO ZÚÑIGA
 FISCALIZACIÓN EXTERNA


 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 16018429
