

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO MCO-GADPN- 004- 2019**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN **PROVISIONAL** DEL CONTRATO ORIGINAL DE CONSTRUCCION DE CABEZALES ABSC: 0+6.700. ASFALTADO 0+3.500; 0+6.700; BACHEO 0+00-7.500 DE LA VIA EN EL SECTOR FLOR DEL VALLE PARROQUIA MUYUNA, CANTON TENA", suscrito el 28-02-2019, entre el GADPN y la Ing. Tania Lisbeth Horna Sánchez.

MONTO DEL CONTRATO 24.861,57 USD.

En la ciudad de Tena a los 21 de junio del 2019 Comparecen, por una parte el Ing. Eduardo Cevallos - Director de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el desarrollo, miembro de la comisión designado por el por resolución administrativa # 009 de 15 de junio de 2019, el Ing. Manuel Guapulema - Administrador de ejecución de obras Civiles, según resolución administrativa # 010 del 3 de junio 2019 y por otra parte la Ing. Tania Lisbeth Horna Sánchez., en su calidad de Contratista, quienes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega **Recepción Provisional** de la obra contenida en las siguientes cláusulas:

a) ANTECEDENTES:

Mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la Ing. Tania Lisbeth Horna Sánchez. Por un valor de 24.861,57 + IVA., se adjudicó el contrato de **"CONSTRUCCION DE CABEZALES ABSC: 0+6.700. ASFALTADO 0+3.500, 0+6.700; BACHEO 0+00-7.500 DE LA VIA EN EL SECTOR FLOR DEL VALLE PARROQUIA MUYUNA, CANTON TENA"**, suscrito el 28-02-2019, entre el GADPN y la Ing. Tania Lisbeth Horna Sánchez - MCO-GADPN-004- 2019, con un plazo de ejecución de 60 Días calendario contados a partir de la entrega del anticipo.

b) INSPECCIÓN DE LA OBRA:

Una vez verificada la Obra, se establece que fue ejecutada la misma de acuerdo a lo previsto en los documentos habilitantes entregados al Contratista por parte del contratante y recibido a satisfacción por la comisión de recepción.

b.1 OBSERVACIONES:

Ninguna

c) LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.

Fecha de suscripción del contrato:	28/02/2019
Fecha de inicio de la obra	12/04/2019
Plazo de ejecución:	60 días a partir de la entrega del anticipo.
Fecha de entrega del anticipo	11/04/2019
Fecha de terminación de contrato:	11/06/2019
Fecha de solicitud de recepción provisional:	07/06/2017
Fecha de solicitud de recepción definitiva:	
Incremento de plazo por órdenes de cambio:	0 días
Incremento de plazo por órdenes de suspensión:	0 días
Incremento de plazo por fuerza mayor:	
Fecha real de terminación del contrato:	06/05/2019
Como resultado de la liquidación de plazos el contratista NO (X) - SI () tiene mora	
Mora.0 días.	

d) **LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:**

TRABAJOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS

ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDADES		%
			CONTRATADO	EJECUTADO	
1	ACERAS DE H.S. FC=180KG/CM2 E=7CM-ESCOBILLADO UBICACIÓN ABSC: 6+700	m2	105,00	122,19	116,37
2	MURO DE H.S. FC=180 KG/CM2 TIPO B (CABEZALES)	m3	7,77	6,86	88,29
3	LEVANTAMIENTO Y DESALOJO DE ASFALTO AL COSTADO DE LA VÍA	m3	42,00	69,44	165,33
4	BASE GRANULAR CLASE III (INCLUYE TRANSPORTE)	m3	18,00	17,36	96,44
5	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION	lts	415,00	399,28	96,21
6	CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR (INCLUYE TRANSPORTE)	m2	360,00	347,20	96,44
7	EXCAVACION Y RELLENO DE ESTRUCTURAS MENORES	m3	8,40	23,51	279,88
8	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUSAMIENTOS	m3	10,00	9,25	92,50
9	CUNETAS H.S. FC=180 KG/CM2, CLASE C, INCLUYE ENCOFRADO	m	16,20	6,17	38,09
10	MARCAS DE PAVIMENTO (PINTURA 1 FRANJA ANCHO= 0,10M, INCLUYE MICROESFERAS), AMARILLO; BLANCA	m	100,00	0,00	0,00
11	CONTRAPISO H.S. FC=180 KG/CM2	m2	13,44	13,92	103,57
12	LEVANTAMIENTO Y DESALOJO DE ASFALTO AL COSTADO DE LA VÍA UBICACIÓN ABSC: 3+500	m3	18,00	20,13	111,63
13	BASE GRANULAR CLASE III (INCLUYE TRANSPORTE)	m3	12,00	6,71	55,92
14	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION	lts	100,00	151,80	151,80
15	CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR (INCLUYE TRANSPORTE)	m2	120,00	134,20	111,83
16	CUNETAS H.S. FC=180 KG/CM2, CLASE C, INCLUYE ENCOFRADO	m	3,75	0,00	0,00
17	MARCAS DE PAVIMENTO (PINTURA 1 FRANJA ANCHO= 0,10M, INCLUYE MICROESFERAS), AMARILLO	m	45,00	0,00	0,00
18	BACHE 0+000- 0+7,500 DE LA VÍA TENA-ATACAPIASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION	lts	50,00	81,58	162,56
19	ASFALTO PARA CARPETA EN BACHE E=0,050, HASTA 1 M2	u	50,00	70,00	140,00
20	CONFORMACION DE AREA DE BACHEO	u	50,00	70,00	140,00



VALORES PAGADOS POR PLANILLA:


PLANILLA LIQUIDACION	
RETENCIONES	VALOR
	24.567,69
	ANTICIPO
	12.430,79
	MORA()
	OTROS
	0,00
LIQUIDO	12.136,90

La institución adeuda al Contratista 12.136,90 usd. + IVA.

DEVOLUCIONES:

LAS GARANTIAS DE LEY,

Para constancia de fe y conformidad con lo expresado, se suscribe la presente Acta de RECEPCION PROVISIONAL, en original y cuatro copias de igual tenor y contenido, por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.

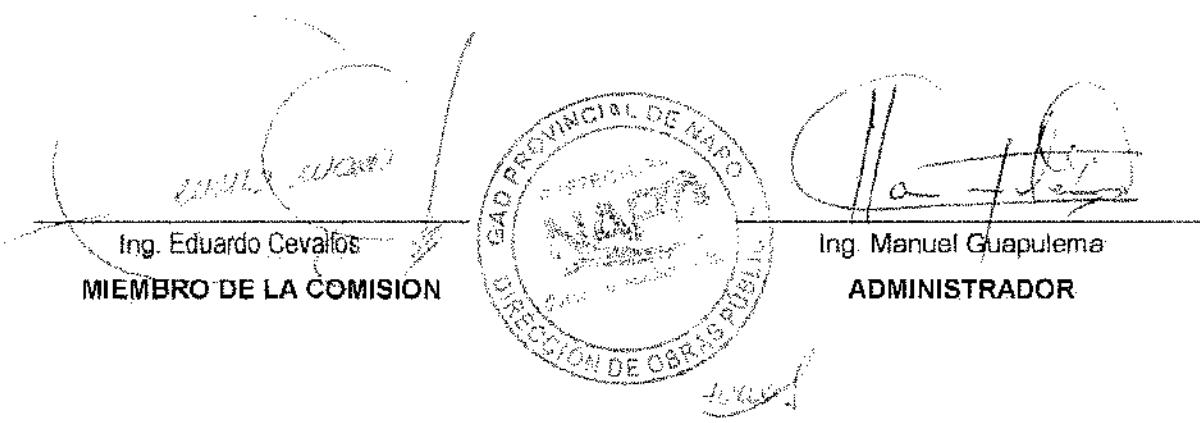

Ing. Eduardo Cevallos
MIEMBRO DE LA COMISION

Ing. Manuel Guapulema
ADMINISTRADOR

Ing. Tania Lisbeth Horna Sánchez.
CONTRATISTA
