

INFORME DE FISCALIZACIÓN Nro. 14

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DESDE EL PUENTE SOBRE EL RÍO PUSUNO - AHUANO, L= 14.36 KM, TERCERA ETAPA, PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.

Informe mensual:

Planilla Nro. 14

Período:

Desde 1/junio/2023 a 30/junio/2023

Fecha de elaboración:

12 de octubre de 2023

A. GENERALIDADES

A.1 PERSONAL TECNICO:

CONTRATANTE:

GAD PROVINCIAL DE NAPO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

Ing. Civil Jimmy Villacis

ADMINISTRADOR DE FISCALIZACION:

Ing. Civil Mauricio Carrera.

FISCALIZACION:

CONSORCIO FRONTERA SANEA VIAL

JEFE DE FISCALIZACION:

Ing. Byron López.

RESIDENTE DE FISCALIZACION:

Ing. Cesar Vaca Sanchez.

RESIDENTE DE FISCALIZACION:

Ing. Marco Molina Sierra.

FISCALIZADOR AMBIENTAL GADPN:

Ing. Jorge Mopocita Siza.

FISCALIZADOR ESPECIALISTA VIAL:

Ing. Christian Roberto Ordoñez Pambi

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD AMB.: Ing. Humberto Hidalgo Basantes Espinoza

TOPÓGRAFO:

Ing. Fausto Ramiro Murillo Utreras

CONTRATISTA:

CONSORCIO RIO PUSUNO AHUANO

SUPERINTENDENTE:

Ing. Rómulo Adolfo Tamayo Gonzales

RESIDENTE DE OBRA:

Ing. Ángel Ney Quezada Yumbo

RESIDENTE DE OBRA:

Ing. Reina Gallegos Carlos Vinicio

RESIDENTE AMBIENTAL:

Ing. Soraya Gianinna Ruiz Baquero

INGENIERO EN SEGURIDAD:

Ing. Cristian Omar Escobar Bosques

TOPÓGRAFO:

Ing. Jorge Saul Chimbo Valladolid

A.2 DATOS CONTRACTUALES.

CONTRATO DE OBRA:

LICO-GADPN-006-2021

PROCESO:

LICO-GADPN-006-2021

MONTO:

USD 7'291.420,89 sin IVA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

30 de marzo de 2022.

PLAZO CONTRACTUAL:

365 días.

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:

14 de abril de 2022.

FECHA INICIO CONTRACTUAL:

15 de abril de 2022.

FECHA INICIO DE OBRA:

20 de abril de 2022.

FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO:

14 de abril de 2023.

FECHA PRIMERA SUSPENSIÓN:

15 de junio de 2022

FECHA REINICIO:

01 de julio de 2022

FECHA DE AMPLIACION DE PLAZO:

05 de mayo de 2023

PRORROGA DE PLAZOS:

169 días.

FECHA REAL DE TERMINACIÓN DEL PLAZO:

21 de octubre de 2023

B. EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

B.1 AVANCE ECONÓMICO.

A la fecha la Contratante ha pagado a la Contratista por anticipo y planillas de avance de obra, los siguientes valores de acuerdo al cuadro:

CONCEPTO	MONTO (USD)
Anticipo (40%)	2'916.568,36
Planilla Nro. 1	253,737.83
Planilla Nro. 2	292,004.13
Planilla Nro. 3	444,392.24
Planilla Nro. 4	377,912.56
Planilla Nro. 5	548,273.03
Planilla Nro. 6	487,029.95
Planilla Nro. 7	450,267.26
Planilla Nro. 8	499,625.93
Planilla Nro. 9	805,443.94
Planilla Nro. 10	515,200.08
Planilla Nro. 11	433,337.63
Planilla Nro. 12	185,876.96
Planilla Nro. 13	570,664.61
Planilla Nro. 14	396,548.03


B.2 DEDUCCIÓN DEL ANTICIPO

CONCEPTO	MONTO(USD)
Valor del anticipo (40 %)	2'916.568,36
Amortización del anticipo Planilla Nro. 01	101,495.13
Amortización del anticipo Planilla Nro. 02	116,801.65
Amortización del anticipo Planilla Nro. 03	177,756.90
Amortización del anticipo Planilla Nro. 04	151,165.02
Amortización del anticipo Planilla Nro. 05	219,309.21
Amortización del anticipo Planilla Nro. 06	194,811.98
Amortización del anticipo Planilla Nro. 07	180,106.90
Amortización del anticipo Planilla Nro. 08	199,850.37
Amortización del anticipo Planilla Nro. 09	322,177.58
Amortización del anticipo Planilla Nro. 10	206,080.03
Amortización del anticipo Planilla Nro. 11	173,335,05
Amortización del anticipo Planilla Nro. 12	74,350,78
Amortización del anticipo Planilla Nro. 13	228,265.84
Amortización del anticipo Planilla Nro. 14	158,619.21
Valor por devengar	412,442.71

B.3 DEDUCCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	MONTO (USD)
Valor del contrato	7'291.420,89
Planilla Nro.1	253,737.83
Planilla Nro.2	292,004.13
Planilla Nro.3	444,392.24

Planilla Nro.4	377,912.56
Planilla Nro.5	548,273.03
Planilla Nro.6	487,029.95
Planilla Nro. 7	450,267.26
Planilla Nro. 8	499,625.93
Planilla Nro. 9	805,443.94
Planilla Nro. 10	515,200.08
Planilla Nro. 11	433,337.63
Planilla Nro. 12	185,876.96
Planilla Nro. 13	570,664.61
Planilla Nro. 14	396,548.03
Saldo del contrato	1'031.106,71

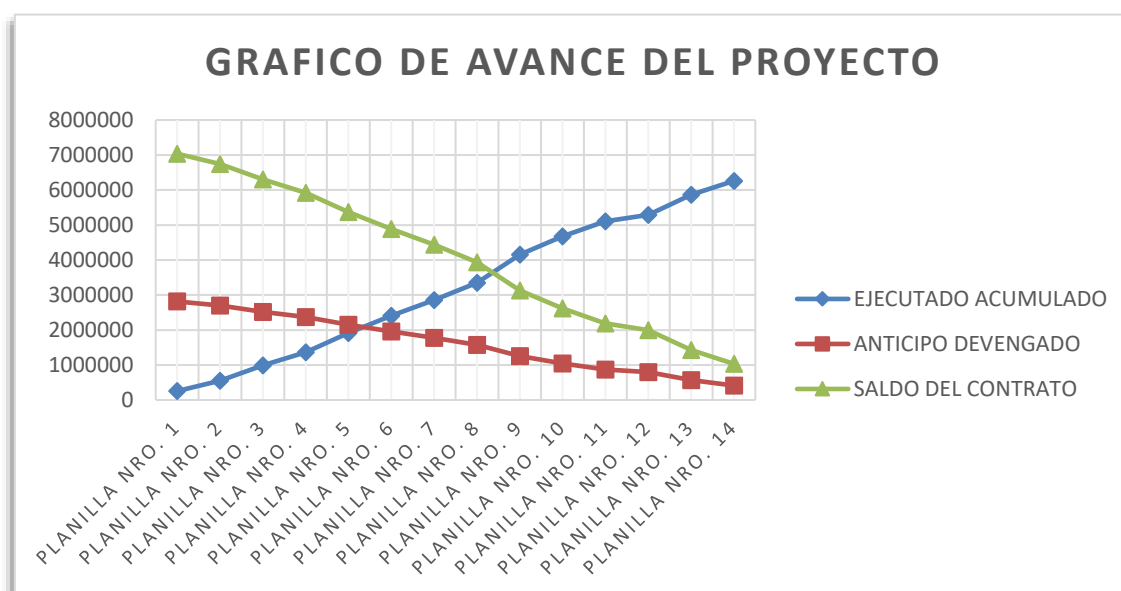

B.4 REAJUSTE DE PRECIOS (Numeral 9.3)

REAJUSTES DE ANTICIPOS	
Reajuste Anticipo Definitivo:	\$110.829,60
Reajuste Planilla 1 provisional:	\$5.785,22
Reajuste Planilla 2 provisional:	\$8.059,31
Reajuste Planilla 3 provisional:	\$12.265,23
Reajuste Planilla 4 provisional:	\$10.657,13
Reajuste Planilla 5 provisional:	\$17.764,05
Reajuste Planilla 6 provisional:	\$16.071,99
Reajuste Planilla 7 provisional:	\$12,967.70
Reajuste Planilla 8 provisional:	\$14.389,23
Reajuste Planilla 9 provisional:	\$23.196,79
Reajuste Planilla 10 provisional:	\$18.856,32

Reajuste Planilla 11 provisional:	\$17.420,17
Reajuste Planilla 12 provisional:	\$8.252,94
Reajuste Planilla 13 provisional:	\$26.022,31
Reajuste Planilla 14 definitivo:	\$18.082,59

Se realizó el cálculo del reajuste de precios definitivos de la planilla Nro. 14, dando un valor de **18.082,59USD**.

B.5 AVANCE FÍSICO Y PROGRAMADO

El avance físico del proyecto y su relación con el avance programado se ha desarrollado de acuerdo al siguiente cuadro que hace relación a las cantidades programadas y a las cantidades ejecutadas según avance real de la obra hasta el periodo de reporte:

Planilla Nro. 14			Monto
Programado	Inversión	Parcial	553.195,38
		Acumulado	4'840.376,13
	Porcentaje	Parcial	7.59%
		Acumulado	66.38%
Ejecutado	Inversión	Parcial	396,548.03
		Acumulado	6'260,314.18
	Porcentaje	Parcial	5.44%
		Acumulado	85.86%
Porcentaje parcial (respecto al monto total)			5.44%
Porcentaje total			85.86%

B.6 LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. (Cláusula Octava del contrato)

LIQUIDACIÓN DE PLAZOS	FECHAS, MONTOS, MORAS Y MULTAS	OBSERVACIONES
MONTO DEL CONTRATO	7'291.420,89	LICO-GADPN-006-2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	30 DE MARZO DEL 2022	
PLAZO CONTRACTUAL	365 DIAS	
FECHA ENTREGA DEL ANTICIPO	14 DE ABRIL DEL 2022	
FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL	15 DE ABRIL DEL 2022	
FECHA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	14 DE ABRIL DEL 2023	
FECHA PRIMERA SUSPENSIÓN:	15 DE JUNIO DEL 2023	ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO N.-1
ORDEN DE REINICIO:	1 DE JUNIO DEL 2022	Oficio Nro. 003-RN-2022-OFCP
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO:	5 DE MAYO DEL 2023	
AMPLIACION DE PLAZOS	169 DIAS	
Ampliación de Plazo Nro.1	17 DE ABRIL DEL 2023	Resolución Nro. GADPN-DA-2023-0081-RES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO MAS AMPLIACION:	21 DE OCTUBRE 2023	
PLANILLA 1 DE AVANCE DE OBRA - PERIODO: 20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2022		
FECHA DE SOLICITUD DE INGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA - CONTRATISTA	7 DE JUNIO DEL 2022	OF. Nro.CRPA-010-2022
DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANILLA		0 días
PLANILLA 2 DE AVANCE DE OBRA - PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2022		
FECHA DE SOLICITUD DE INGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA - CONTRATISTA	7 DE JULIO DEL 2022	OF. Nro.CRPA-036-2022

DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANILLA		0 días
PLANILLA 3 DE AVANCE DE OBRA - PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO DEL 2022		
FECHA DE SOLICITUD DE INGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA - CONTRATISTA	5 DE AGOSTO DEL 2022	OF. Nro.CRPA-070-2022
DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANILLA		0 días
PLANILLA 4 DE AVANCE DE OBRA - PERIODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022		
FECHA DE SOLICITUD DE INGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA - CONTRATISTA	7 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	OF. Nro.CRPA-100-2022
DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANILLA		0 días
PLANILLA 5 DE AVANCE DE OBRA - PERIODO: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
FECHA DE SOLICITUD DE INGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA - CONTRATISTA	7 DE OCTUBRE DEL 2022	OF. Nro.CRPA-114-2022
DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANILLA		0 días
PLANILLA 6 DE AVANCE DE OBRA - PERIODO: 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022		
FECHA DE SOLICITUD DE INGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA - CONTRATISTA	9 DE NOVIEMBRE DEL 2022	OF. Nro.CRPA-120-2022
DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANILLA		0 días
PLANILLA 7 DE AVANCE DE OBRA - PERIODO: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022		
FECHA DE SOLICITUD DE INGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA - CONTRATISTA	7 DE DICIEMBRE DEL 2022	OF. Nro.CRPA-138-2022
DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANILLA		0 días
PLANILLA 8 DE AVANCE DE OBRA - PERIODO: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022		
FECHA DE SOLICITUD DE INGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA - CONTRATISTA	9 DE ENERO DEL 2023	OF. Nro.CRPA-004-2023
DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANILLA		0 días
PLANILLA 9 DE AVANCE DE OBRA - PERIODO: 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023		
FECHA DE SOLICITUD DE INGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA - CONTRATISTA	7 DE FEBRERO DEL 2023	OF. Nro.CRPA-024-2023
DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANILLA		0 días
PLANILLA 10 DE AVANCE DE OBRA - PERIODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		
FECHA DE SOLICITUD DE INGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA - CONTRATISTA	7 DE MARZO DEL 2023	OF. Nro.CRPA-043-2023
DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANILLA		0 días
PLANILLA 11 DE AVANCE DE OBRA - PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DEL 2023		
FECHA DE SOLICITUD DE INGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA - CONTRATISTA	10 DE ABRIL DEL 2023	OFICIO NO. CRPA-081-2023
DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANILLA		0 días
PLANILLA 12 DE AVANCE DE OBRA - PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023		
FECHA DE SOLICITUD DE INGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA - CONTRATISTA	08 DE MAYO DE 2023	OFICIO NO. CRPA-110-2023
DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANILLA		0 días
PLANILLA 13 DE AVANCE DE OBRA - PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DEL 2023		
FECHA DE SOLICITUD DE INGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA - CONTRATISTA	07 DE JUNIO DE 2023	OFICIO NO. CRPA-132-2023
DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANILLA		0 días
PLANILLA 14 DE AVANCE DE OBRA - PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		
FECHA DE SOLICITUD DE INGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA - CONTRATISTA	07 DE JULIO DE 2023	OFICIO NO. CRPA-187-2023
FECHA DE ENVÍO DE PLANILLA POR PARTE DEL ADMINISTRADOR AL FISCALIZADOR	13 DE JULIO DE 2023	OFICIO NRO. GADPN-DOP-2023-0221
FECHA DE DEVOLUCIÓN PLANILLA POR PARTE DEL FISCALIZADOR AL CONTRATISTA	21 DE JULIO DE 2023	OFICIO NO. CFSV-139-2023
FECHA DE SOLICITUD DE REINGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATISTA	26 DE JULIO DE 2023	OFICIO NO. CRPA-205-2023
FECHA DE DEVOLUCIÓN PLANILLA POR PARTE DEL FISCALIZADOR AL CONTRATISTA	04 DE AGOSTO DE 2023	OFICIO NO. CFSV-148-2023
FECHA DE SOLICITUD DE REINGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATISTA	09 DE AGOSTO DE 2023	OFICIO NO. CRPA-218-2023
FECHA DE DEVOLUCIÓN PLANILLA POR PARTE DEL FISCALIZADOR AL CONTRATISTA	18 DE AGOSTO DE 2023	OFICIO NO. CFSV-164-2023
FECHA DE SOLICITUD DE REINGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATISTA	23 DE AGOSTO DE 2023	OFICIO NO. CRPA-227-2023

FECHA DE DEVOLUCIÓN PLANILLA POR PARTE DEL FISCALIZADOR AL CONTRATISTA	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	OFICIO NO. CFSV-180-2023
FECHA DE SOLICITUD DE REINGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATISTA	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	OFICIO NO. CRPA-234-2023
FECHA DE DEVOLUCIÓN PLANILLA POR PARTE DEL FISCALIZADOR AL CONTRATISTA	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	OFICIO NO. CFSV-193-2023
FECHA DE SOLICITUD DE REINGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATISTA	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	OFICIO NO. CRPA-237-2023
FECHA DE DEVOLUCIÓN PLANILLA POR PARTE DEL FISCALIZADOR AL CONTRATISTA	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	OFICIO NO. CFSV-204-2023
FECHA DE SOLICITUD DE REINGRESO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATISTA	04 DE OCTUBRE DE 2023	OFICIO NO. CRPA-242-2023
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PLANILLA POR FISCALIZACIÓN	12 DE OCTUBRE DE 2023	OFICIO NO. CFSV-220-2023
DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANILLA		0 DÍAS
PRORROGA		
SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO	26 DE DICIEMBRE DEL 2022	OFICIO NO. CRPA-148-2022
PRORROGA DE PLAZO	169 DÍAS	169 DÍAS
SUSPENSIÓN DE PLAZO		
SUSPENSIÓN DEL PLAZO	15 DE JUNIO DEL 2022	15 DÍAS PARO NACIONAL
INICIO DE ACTIVIDADES POR SUSPENSIÓN DEL PLAZO	1 DE JULIO DEL 2022	OFICIO NRO. 003-RN-2022-OFCP
MULTAS		
MULTA DIARIA 1X1000		
DÍAS NO JUSTIFICADOS		
MULTA TOTAL		
AVANCE ACTUAL		
PLAZO CONTRACTUAL	365 DÍAS	
SUSPENSIÓN DE PLAZO:	15 DÍAS	
AMPLIACION DE PLAZO	169 DÍAS	
CANT. DÍAS PERIODO PLANILLA 1	41 DÍAS	
CANT. DÍAS PERIODO PLANILLA 2	30 DÍAS	
CANT. DÍAS PERIODO PLANILLA 3	31 DÍAS	
CANT. DÍAS PERIODO PLANILLA 4	31 DÍAS	
CANT. DÍAS PERIODO PLANILLA 5	30 DÍAS	
CANT. DÍAS PERIODO PLANILLA 6	31 DÍAS	
CANT. DÍAS PERIODO PLANILLA 7	30 DÍAS	
CANT. DÍAS PERIODO PLANILLA 8	31 DÍAS	
CANT. DÍAS PERIODO PLANILLA 9	31 DÍAS	
CANT. DÍAS PERIODO PLANILLA 10	28 DÍAS	
CANT. DÍAS PERIODO PLANILLA 11	31 DÍAS	
CANT. DÍAS PERIODO PLANILLA 12	30 DÍAS	
CANT. DÍAS PERIODO PLANILLA 13	31 DÍAS	
CANT. DÍAS PERIODO PLANILLA 14	30 DÍAS	
PLAZO TRANSCURRIDO HASTA LA PRESENTE	436 DÍAS	
CANT. DÍAS A FAVOR DEL CONTRATISTA	113 DÍAS	

B.7 MULTAS (Art. 71 de la LOSNCP)

A la fecha de reporte, no aplica multas por entrega tardía de la planilla o incumplimiento del cronograma valorado de trabajos

C. ASPECTO TECNICO - AVANCE DE OBRA.

C.1 ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES DEL PERÍODO.

En el presente período se desarrollaron actividades correspondientes a la ejecución de los rubros objeto de este contrato por un lapso de 31 días de acuerdo al cronograma valorado reprogramado de trabajos, y que constan descritas en el libro de obra, a esto se realizó liquidaciones de algunos rubros.

En este período se ejecutó los siguientes rubros:

- Transporte de capa de rodadura
- Transporte de arena para protección y secado
- Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta (e=7.5 cm) inc. transporte dmf=10 km
- Asfalto re para imprimación 1.4 Itxm2
- Asfalto re para liga de adherencia 0.8 Itxm2
- Arena para protección y secado

C.2.1 MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA.

En el avance de la obra descrita se han utilizado materiales adecuados para cada trabajo y conforme a las especificaciones técnicas de cada rubro; además el equipo y herramientas utilizados en la obra son:

- Planta de Asfalto,
- Una Terminadora de Asfalto,
- Tres Rodillos lisos,
- Una Distribuidora de Asfalto,
- Diez Volquetas,
- Una Barredora,
- Dos Trituradoras
- Una Saranda

C.2.2 MANO DE OBRA

Se observa que el personal que interviene en la obra es el necesario y técnicamente apto para la ejecución de los trabajos ejecutados.

- Superintendente.
- Dos Ing. Residente de Obra,
- Ing. Ambiental,
- Ing. Seguridad,
- Trece Choferes,
- Diez Operadores de equipo pesado,
- Dos Topógrafo,
- Cadenero,
- Ayudantes,
- Peones,

C.2.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PERSONAL

Por parte de fiscalización se ha dado las indicaciones y recomendaciones necesarias en lo referente a ejecución de obra, se dispone al contratista dotar de equipo de protección personal a todos los obreros: botas, casco, chalecos y guantes.

C.2.4 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

En el desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato y en la ejecución de los rubros contractuales se ha observado el cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales.

D. AVANCE ECONÓMICO DEL SUBCONTRATISTA.

CONCEPTO	MONTO (USD)
Planilla Nro. 1	447,287.86
Planilla Nro. 2	249,396.58

E. DECISIONES IMPORTANTES

- Por parte de la Fiscalización continuamente se han impartido disposiciones referentes al avance mismo de la obra en lo relativo al proceso técnico-constructivo de acuerdo al caso y se ha realizado un seguimiento permanente del avance realizando visitas y recorrido general de todo el proyecto.
- Se recomienda al contratista la observancia del decreto ejecutivo 2393. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. Código de trabajo art.420 y 174(reglamento de seguridad y salud ocupacional).

F. DOCUMENTACIÓN CURSADA.

ENVIADOS

- Oficio No. CFSV-093-2023-M01, del 02 de junio del 2023, mediante el cual el Procurador Común Consorcio Frontera SANA VIAL; devuelve la planilla N° 12, correspondiente del 1 al 30 de abril del 2023, con observaciones en la misma.
- Oficio No. CFSV-099-2023, del 09 de junio del 2023, mediante el cual el Procurador Común Consorcio Frontera SANA VIAL; devuelve la planilla N° 3 del contrato Complementario, correspondiente del 1 al 14 de marzo del 2023, con observaciones en la misma.
- Oficio No. CFSV-104-2023, del 16 de junio del 2023, mediante el cual el Procurador Común Consorcio Frontera SANA VIAL; devuelve la planilla N° 12, correspondiente del 1 al 30 de abril del 2023, con observaciones en la misma.
- Oficio No. CFSV-108-2023, del 20 de junio del 2023, mediante el cual el Procurador Común Consorcio Frontera SANA VIAL; ingresa el Informe de Fiscalización N° 14 correspondiente al periodo de 18 de mayo al 17 de junio del 2023, al administrador de Fiscalización.
- Oficio No. CFSV-109-2023, del 20 de junio del 2023, mediante el cual el Procurador Común Consorcio Frontera SANA VIAL; ingresa la capacidad de carga gabarra y puentes rio Pusuno y Pununo.
- Oficio No. CFSV-110-2023, del 20 de junio del 2023, mediante el cual el Procurador Común Consorcio Frontera SANA VIAL; verifica el cumplimiento de requisito para cambio de subcontratista.
- Oficio No. CFSV-113-2023, del 23 de junio del 2023, mediante el cual el Procurador Común Consorcio Frontera SANA VIAL; devuelve la planilla N° 3 del contrato Complementario, correspondiente del 1 al 14 de marzo del 2023, con observaciones en la misma.
- Oficio No. CFSV-118-2023, del 29 de junio del 2023, mediante el cual el Procurador Común Consorcio Frontera SANA VIAL; Ingresa la planilla N° 11, de avance de obra correspondiente del 1 al 28 de febrero del 2023, al administrador de contrato.

- Oficio No. CFSV-120-2023, del 30 de junio del 2023, mediante el cual el Procurador Común Consorcio Frontera SANAEE VIAL; devuelve la planilla N° 12, correspondiente del 1 al 30 de abril del 2023, con observaciones en la misma.

RECIBIDOS

- Oficio No. CRPA-133-2023, del 07 de junio del 2023, mediante el cual el Procurador Común Consorcio Rio Pusuno Ahuano; ingresa la planilla N° 12 de avance de obra del periodo 1 al 30 de abril del 2023.
- Oficio No. CRPA-144-2023, del 14 de junio del 2023, mediante el cual el Procurador Común Consorcio Rio Pusuno Ahuano; ingresa la planilla N° 11 de avance de obra del periodo 1 al 31 de marzo.
- Oficio No. CRPA-145-2023, del 14 de junio del 2023, mediante el cual el Procurador Común Consorcio Rio Pusuno Ahuano; ingresa la planilla N° 3 de contrato Complementario del periodo 1 al 14 de marzo.
- Oficio No. GADPN-DOP-2023-0200, del 19 de junio del 2023, mediante el cual el Administrador de contrato solicita la verificación de capacidad de carga de la gabarra de Ahuano y de los puentes de Pusuno y Pununo.
- Oficio No. CRPA-151-2023, del 21 de junio del 2023, mediante el cual el Procurador Común Consorcio Rio Pusuno Ahuano; ingresa la planilla N° 12 de avance de obra del periodo 1 al 30 de abril del 2023.
- Oficio No. CRPA-158-2023, del 28 de junio del 2023, mediante el cual el Procurador Común Consorcio Rio Pusuno Ahuano; ingresa la planilla N° 11 de avance de obra del periodo 1 al 31 de marzo.
- Oficio No. CRPA-159-2023, del 28 de junio del 2023, mediante el cual el Procurador Común Consorcio Rio Pusuno Ahuano; ingresa la planilla N° 3 de contrato Complementario del periodo 1 al 14 de marzo.

G. REUNIONES.

Durante este período, se han realizado reuniones semanales conjuntamente con la fiscalización y contratista de la obra, para la revisión de avances, ejecución de trabajos y particularidades técnicas:

- Reunión de trabajo del 6 de junio, del Consorcio Frontera Sanea Vial en las oficinas de la dirección de fiscalización, para constatar del personal técnico del proyecto.
- Reunión de trabajo del 15 de junio, del Consorcio Frontera Sanea Vial en las oficinas de la dirección de fiscalización, para constatar los trabajos realizados en el proyecto.
- Reunión de trabajo del 18 de junio, del Consorcio Frontera Sanea Vial en las oficinas de la dirección de fiscalización, para constatar los trabajos realizados en el proyecto.
- Reunión de trabajo del 29 de junio, del Consorcio Frontera Sanea Vial en las oficinas de la dirección de fiscalización externa, para revisar ejecución del proyecto.

H. CONCLUSIONES:

- Para la ejecución de la obra se emplearon materiales calificados conforme al requerimiento y los trabajos se realizaron cumpliendo las especificaciones técnicas y el personal de obreros necesarios.
- El avance general de la obra se desarrolló de acuerdo al cronograma reprogramado valorado de trabajos, alcanzando un porcentaje de ejecución de **5.44%**, y un acumulado de 85.86% en comparación con lo programado ejecutado 7.59%, y un acumulado de 66.38% por lo tanto, la contratista cumple con el cronograma programado, y a la vez está por encima del acumulado, por lo que esta Fiscalización Aprueba la planilla N° 14.

I. RECOMENDACIONES.

Se recomienda al contratista cumplir con las especificaciones técnicas y las normas de seguridad y salud de los trabajadores, así como también el plan de manejo ambiental.

Atentamente.

CONSORCIO FRONTERA SANEA VIAL
FISCALIZACION.
