

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

Informe de Seguimiento y Evaluación de los Proyectos del Presupuesto Participativo 2023 AGOSTO a DICIEMBRE

INDICE

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO.....	3
3. DEFINICIONES.....	3
4. METODOLOGÍA.....	5
5. Seguimiento y Evaluación de los Proyectos del Presupuesto Participativo 2023.....	6
Obras y Estudios.....	6
(ZONA ALTA).....	6
(ZONA BAJA).....	8
Maquinaria Pesada y Liviana.....	9
5.1 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y TALLERES.....	11
5.2 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN.....	12
5.4 DIRECCIÓN DE NACIONALIDADES Y TURISMO.....	12
6. AVANCE DE LOS PROYECTOS DE CADA DIRECCIÓN.....	13
7. CONCLUSIONES.....	14
8. RECOMENDACIONES.....	14
9. ANEXOS.....	16

1. INTRODUCCIÓN

El Seguimiento y Evaluación es un instrumento de gestión de la planificación estratégica que se utiliza para llevar adelante el cumplimiento del Presupuesto Participativo 2023, actividades que están definidas para el cumplimiento y ejecución de los proyectos de cada área con miras a alcanzar los objetivos estratégicos de la institución.

El informe de seguimiento y evaluación del Presupuesto Participativo 2023 se enmarca en el **Art. 16.** de la **Ordenanza que regula la Distribución Económica del Presupuesto Participativo a nivel Territorial de la Provincia de Napo**, donde habla; *El Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Participativo se lo realizará de acuerdo al reporte de los Administradores de cada uno de los proyectos, el proceso estará a cargo de la Subdirección de Participación Ciudadana, quien generará los informes mensuales que servirán como insumo para el cumplimiento de Metas de resultado del PDYOT vigente. Además, para la realización del seguimiento y evaluación del Presupuesto participativo, el/la subdirector/a de Participación Ciudadana designará a un técnico de carrera para realizar los informes mensuales y así existiere continuidad de los mismos.*

El presente documento constituye un instrumento que permite la evaluación periódica de la gestión y, por ende, la toma de decisiones en base a las dificultades y aciertos encontrados en este ejercicio técnico.

Este trabajo se realizó con la información presupuestaria proporcionada por la Dirección Financiera, sustentos técnicos de las otras direcciones, y un cronograma de trabajo que se cumplió desde el 01 de agosto al 17 de octubre de 2023, liderado por la Subdirección de Participación Ciudadana.

El presente documento constituye un instrumento que permite la evaluación periódica de la gestión y, por ende, la toma de decisiones en base a las dificultades y aciertos encontrados en este ejercicio técnico.

2. OBJETIVO

Informar el avance del seguimiento correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre, mediante la presentación de resultados del seguimiento y evaluación del Presupuesto Participativo 2023

3. DEFINICIONES

Seguimiento: Es una acción para ajustar los detalles o hacer posibles cambios en los planes según las necesidades o las condiciones coyunturales que forma el contexto de implementación del proyecto/programa. El sistema de seguimiento debe ser integrado en el trabajo cotidiano interno coordinado por las personas responsables de las actividades del proyecto.

Evaluación: Es una valoración de una acción que ocurre en un momento específico. Se puede evaluar, por ejemplo, hasta qué grado fue ejecutado con eficiencia, o hasta qué grado los objetivos y resultados fueron logrados y/o hasta qué grado el proyecto tuvo impacto en la vida de las personas.

La evaluación muchas veces requiere una visión más amplia y analítica que el propio proyecto, en donde se hace necesario reflexionar sobre el proceso en relación a dificultades y aspectos positivos que pueden afectar de diversa manera el resultado previsto.


La eficiencia: Se la define como la relación que se establece entre el **tiempo**, los **recursos** invertidos y los **logros** obtenidos. Normalmente, se dice que está siendo eficiente cuando se realiza un uso óptimo de los recursos disponibles, y se alcanzan las metas propuestas.

Eficacia: Es la relación que se establece entre las **metas logradas** y programadas, considerando los **tiempos reales** manejados en la ejecución de la acción, proyecto o actividad.

4. METODOLOGÍA

La Subdirección de Participación Ciudadana, implementa una metodología propia articulada en el **Art. 16. de la Ordenanza que regula la Distribución Económica del Presupuesto Participativo a nivel Territorial de la Provincia de Napo**; se realizan los siguientes pasos:

- Se determina el porcentaje de avance que se planteó cumplir en cada uno de los proyectos o actividades, para lo cual se utiliza los rangos según la metodología de Planifica Ecuador, para la evaluación presupuestaria y física.
- Se utiliza la cédula presupuestaria desde agosto a diciembre
- Se determina el estado actual del proyecto.
- Se determina los nombres de los técnicos responsables de los proyectos.
- La evaluación se realiza con los técnicos de cada dirección en fechas establecidas y acordadas (Acta).

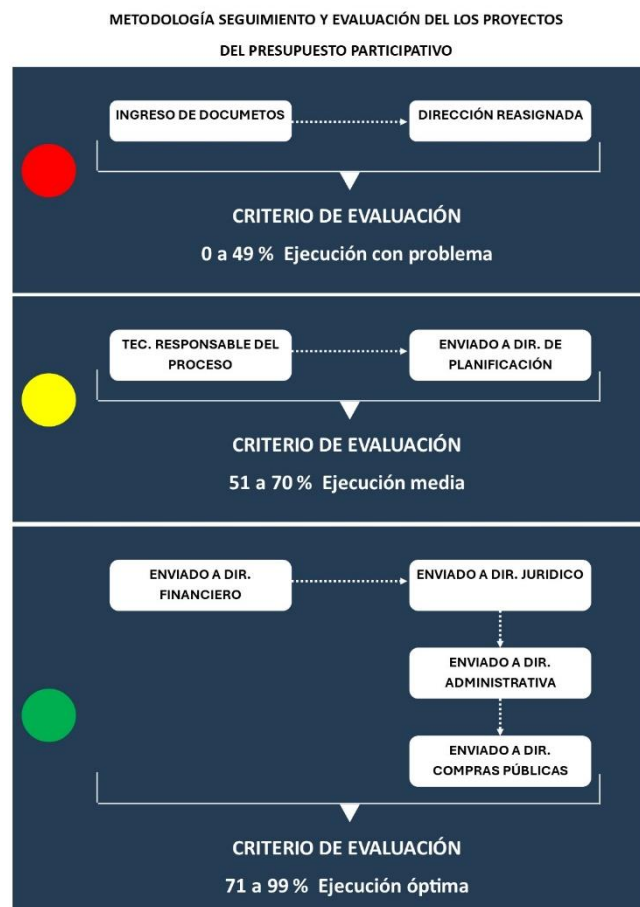

5. Seguimiento y Evaluación de los Proyectos del Presupuesto Participativo 2023.

Obras y Estudios (ZONA ALTA)

CANTONES	N°	GAD PARROQUIALES RURALES	PROYECTOS A EJECUTARSE 2023	INGRESO DE DOC. OFICIALES	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES DE NOVIEMBRE	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES DE DICIEMBRE	TEC. RESPONSABLE	CRITERIO DE SEGUIMIENTO	MESES					% PRESU PUESTARIO	% AVANCE FÍSICO
									Ejecución	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC		
									Media Ejecución con problemas							
QUIJOS	2	COSANGA	Mantenimiento del puente carrozable sobre el río Alizo, sector Alizo.	Ingreso de oficio NO. 075-GADPRC-2023-P. GADPN-DSG-2023-2658-E.	*Esta en la Dirección de Planificación en revisión del Proyecto oportunamente enviarán a OO.PP	* El proceso se encuentra publicado bajo el No.MCO-GADPN-2023-01-01 *El cronograma y calendario fecha estimada de adjudicación 30-11-2023	esta adjudicado, pendiente elaboración de contrato	OO.PP: Cesilia Escobar		25%	25%	25%	99%	99%	0%	0%
			Mantenimiento del puente peatonal sobre el río Cosanga, sector Las Orquídeas.	Ingreso de oficio NO. 075-GADPRC-2023-P. GADPN-DSG-2023-3569-E.	*Estan realizando el Informe Técnico para solicitar Topografía	Se emitió el Memorando No. 1126-2023-LGV de fecha 16 de octubre 2023 en el cual se concluye que no es procedente realizar en mantenimiento - presupuesto P.P \$30.000		OO.PP: Cesilia Escobar		25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%
	2	CUYUJA	Continuación del proyecto Construcción del puente peatonal sobre el río Quijos, sector Huaco - Cuyuja-Cantón Quijos.	Ingreso de oficio NO. 135-2023-GADPRC. GADPN-DSG-2023-3783-E.	*Se esta pidiendo la Factibilidad, Afectación de Predios a la Dirección de Planificación, este proceso esta donde el Arq. Diego Ramón, oportunamente enviarán a OO.PP	* El Proceso se encuentra en Compras Publicas	esta adjudicado, pendiente elaboración de contrato	OO.PP: Ing. Leonardo Sanchez		25%	25%	25%	85%	99%	0%	0%
			Estudio y mejoramiento del Recinto Ferial de la Junta Parroquial de Cuyuja - Cantón Quijos.	Ingreso de oficio NO. 137-2023-GADPRC. GADPN-DSG-2023-3784-E.	*Una conversación con la Presidenta de la Junta P.en el tema del Recinto ferial no se tiene elaborado el proyecto ya q mención que no tienen el técnico para q elabore, esta solicitando q le ayuden con el proyecto a la Junta P. Cotundo para tomar como referencia y elaborar	* Se emitió un memorando No. 3886-2023-DPPD de fecha 17 de octubre 2023, donde se saca la siguiente conclusión, el proyecto no es posible continuar ya q la necesidad no es la adecuación del recinto ferial, mas bien la necesidad es la elaboración de un proyecto con enfoque turístico, en espera que se soluciones el proyecto no se podrá ejecutar este año.	pasa para el poa 2024, no se ejecuta por tener una visión turística y participación c. debe hacer gestiones para solucionar este inconveniente.	PRODUCCIÓN: Ing. Mariela Cayambe		5%	5%	5%	20%	20%	0%	0%
	1	PAPALLACTA	Repotenciación del Complejo turístico de aguas termales "santa Catalina", Papallacta, Cantón Quijos, provincia de Napo - Etapa 1 y contraparte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Papallacta.	Ingreso de Oficio NO. 194-GADPRP-2023	* La documentación y el proyecto esta ingresado * Aún no envían la documentación y el proyecto al Tec. responsable de la Dirección de Nacionalidades y Turismo. *Hay un problema en el presupuesto del proyecto ya que el valor no consta con lo que tiene la Sub Dirección de Presupuesto.	* Se encuentra en la Dir. de Planificación esperando la factibilidad del proyecto, de ahí se enviara a Financiero, Dir. Admiistativa, Compras Públicas, se encuentra en las etapas finales.	En Compras Públicas para POA 2024	Nacionalidades y turismo: Ing. Jhon Frutos		5%	5%	5%	70%	99%	0%	0%
			Estudios para la construcción del Recinto Ferial en San Francisco de Borja - Cantón Quijos.	Ingreso de oficio NO. 048-GADPB-2023. GADPN-DSG-2023-3178-E.	*Se sigue avanzando en la elaboración de los formularios, no se puede iniciar de manera formal ya que se necesita que los predios o los terrenos le entreguen a nombre del Gad Parroquial para poder iniciar la consultoria, se tiene conocimiento q el trámite esta en etapa de expropiación en la Dirección de Planificación mientras tanto se esta adelantando, la dirección de Planificación envío a Jurídico Memo No. 1259-2023-DP para su	*Se encuentra en este momento en el proceso de expropiación del terreno, Dir. de Planificación y Jurídico, en espera de este documento habilitante mientras tanto no se puede avanzar con el proyecyo.	pasa para el poa 2024, parte legal	PRODUCCIÓN: Ing. Juan Uluma		20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%

CANTONES	N°	GAD PARROQUIALES RURALES	PROYECTOS A EJECUTARSE 2023	INGRESO DE DOC. OFICIALES	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES DE NOVIEMBRE	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES DE DICIEMBRE	TEC. RESPONSABLE	CRITERIO DE SEGUIMIENTO		MESES					% PRESUPUESTARIO	% AVANCE FÍSICO					
									Ejecución	Ejecución Media	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC							
CHACO	1	OYACACHI	Construcción de una Planta Procesadora de Truchas para el gad parroquial de Oyacachi, Cantón Chaco	Aún no ingresa el oficio el señor Presidente de la Junta	*La junta parroquial tiene q presentar el proyecto previo acuerdos pero aun no envia a la Dirección correspondiente.	*En la junta parroquial se mantuvo una reunión el 14-12-23 para exponer observaciones del proyecto presentado por el GADP Oyacachi, concluyendo acuerdos y compromisos: la junta se compromete a legalizar las escrituras del predio, reformulación y ajuste del presupuesto del proyecto. *el GADPN va a motivar una reunión con el Procurador Sindico para la explicación del procedimiento legal del Comodato, en espera de estos compromisos el proyecto se estaria ejecutando el proximo año.	pasa para el poa 2024, gad remite estudios para revisión y el GADP entrego las recomendaciones.	PRODUCCIÓN: Dra. Daisy Montesdeoca								5%	5%	5%	20%	20%	0%	0%
	1	SANTA ROSA	Adquisición Armicos metálicos para el GAD Parroquial Rural de Santa Rosa, cantón El Chaco (\$20.000)		*Solo se ha hecho una inspeccion para verificar los lugares donde se van a colocar	*Solo se ha hecho una inspeccion Memorando No. 2164-2023-DOP del 10 julio 2023 para verificar los lugares donde se van a colocar las alcantarillas.		OO.PP: Ing. Jose Lovato								10%	10%	10%	20%	20%	0%	0%
	1	GONZALO DIAZ DE PINEDA	Cambio de cespel sintético para el Gad. Parroquial de Gonzalo Diaz de Pineda	Acta de Socialización del 12 de octubre 2023	*Esta hecho el proyecto en su totalidad, enviaron a la Dir. De Planificación para elaborar el informe de Factibilidad, con eso pedirán la certificación presupuestaria a la Dir. Financiera y continuarán con el trámite de contratación. *Además el GadpNapo se hará cargo del 100% del presupuesto asignado del proyecto	* El proyecto se encuentra listo con todos los expedientes, solo esta faltando el tema de convenios vencidos que el GADPNAPO	Por Adjudicar	OO.PP: Ing. Paulina Rodriguez								20%	20%	20%	99%	99%	0%	0%
	1	SARDINAS	Construcción del Puente Peatonal colgante de logitud 47 metros sobre el río Sardinas, en la Parroquia Sardinas, Cantón El Chaco.		*El Proyecto esta en los ultimos procesos solo falta el Manual de Operación y Mantenimiento	*El Proyecto esta en los ultimos procesos solo falta el Manual de Operación y Mantenimiento	esta adjudicado, pendiente elaboración de contrato	OO.PP:									25%	25%	25%	99%	99%	0%
	1		Mantenimiento Puente Peatonal río Sardinas grande sector El Angel, Parroquia Sardinas, Cantón El Chaco.		* Este proyecto se encuentra ya enviado para solicitar publicación, a la espera que autoricen y crean la comisión con Memorando No. 2170-2023-DA	este proyecto se encuentra ya enviado para solicitar publicación, a la espera que autoricen y crean la comisión con Memorando No. 2170-2023-DA		OO.PP: Ing. Diana Constante								25%	25%	25%	99%	99%	0%	0%

(ZONA BAJA)

TENA	1	PUERTO NAPO	Reparación y Mantenimiento del puente sobre el río Napo de la parroquia Pto. Napo	Ingreso de oficio NO. GADPRPN-SG-NG-2023-00302-OF-GADPN-DSG-2023-3776-E. - Memorando No. 1190-2023-DP	*no hay avance por motivos de cambio de nombre del proyecto y otros aspectos técnicos	NO PROCEDE	presu.p, pasa poa 2024	Nacionalidades y turismo: Ing. Jhon Frutos		5%	5%	5%	5%	45%	0%	0%
	2	PUERTO NAPO	Fortalecimiento turístico en la parroquia Pto. Napo	Ingreso de oficio NO. GADPRPN-SG-NG-2023-00302-OF-GADPN-DSG-2023-3776-E. - Memorando No. 1190-2023-DP	*no hay avance por motivos de cambio de nombre del proyecto y otros aspectos técnicos	Este proyecto se hizo cambio de nombre por tal razon se empieza desde cero todo el proceso, lamentablemente este año no se va ejecutar.	presu.p, pasa poa 2024	Nacionalidades y turismo: Ing. Jhon Frutos		5%	5%	5%	5%	45%	0%	0%
	1	MUYUNA	Construcción del Polideportivo Etapa 1, esto se construirá mediante un convenio tripartito entre Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, Gobierno Municipal de Tena y Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan de Muyuna.	Ingreso Oficio No. 017-GADPSJM-2019-2023 de fecha 27 de junio-2023 de la Junta P.	*Esta en la Dirección de Planificación en revision del Proyecto oportunamente enviaran a OO.PP	*Actualmente el proyecto esta en etapa de revisión de diseño, costos, nuevos rubros, oportunamente se enviara para q se haga el perfil del proyecto y la factibilidad y finalmente enviaran a OO.PP	Etapa preparatoria en planificación	OO.PP:		25%	25%	25%	75%	75%	0%	0%
ARCHIDONA	1	COTUNDO	Mantenimiento del Recinto Ferial "Victor Toapanta" I Etapa Cotundo.	Ingreso Oficio No. 406-GADPRC-2023 de fecha 06 de septiembre-2023 de la Junta P.	*Disposición para Inspección Memorando Nro. 2832-2023-DP960 Dir. Producción * Se hizo la visita del lugar * hay un error en el Nombre, en espera de las correcciones. * el predio está a nombre del gad municipal por lo que tocaria ver eso antes de cualquier intervención, además el proyecto se debe realizar bajo los lineamientos de agrocalidad, para lo cual se tendra una reunión para determinar los puntos	* En espera que el GADParroquial de Cotundo entregue la escrituras, de igual manera definir los nuevos rubros y el cambio de nombre con el objeto en Mantenimiento.	pasa para poa 2024, Y se debe solucionar la parte legal para ejecutar.	Producción: Ing. Mariela Cayambre		5%	5%	5%	20%	20%	0%	0%
	1	SAN PABLO	Apertura y lastrado de vías desde la Comunidad Pitayacu hasta la Asociación de Servicios Turísticos Islawn Rummy de 3km, existe el estudio pertinente.	Ingreso Oficio No. 031-PGADPRSPU-2023 de la Junta P. (Cod. 2458-E)	* Se encuentra terminada la Topografía * Falta procesar el levantamiento para hacer plano * El estudio de suelo la Ing. Alejandra León se comprometió entregar el día jueves 12 de octubre	* El proyecto actualmente se encuentra en el diseño de vía, se estaria elaborando la documentación para el permiso ambiental, el caso de la mina y luego pedir factibilidad en la Dir. Planificación.	* El proyecto actualmente se encuentra en el diseño de vía, se estaria eleborando la documentación para el permiso ambiental, el caso de la mina y luego pedir factibilidad en la Dir. Planificación.	OO.PP: Ing. Diego Ponce-Ing. José Yanez		5%	5%	5%	70%	75%	0%	0%

Maquinaria Pesada y Liviana

CANTONES	PARROQUIAS	N°	PROYECTOS A EJECUTARSE 2023	INGRESO DE DOC. OFICIALES	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES DE NOVIEMBRE	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES DE DICIEMBRE	TEC. RESPONSABLE	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO		MESES					% PRESUPUESTARIO	% AVANCE FÍSICO
									Ejecución	Ejecución con problema	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC		
CHACO	GONZALO DÍAZ DE PINEDA	1	compra de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Mercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023		TALLERES: Ing. Erick Córdova			40%	40%	40%	75%	99%	0%	100%
	SANTA ROSA	1	adquisición de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Mercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023		TALLERES: Ing. Erick Córdova			40%	40%	40%	75%	99%	0%	100%
	LINARES	1	adquisición de un vehiculo de capacidad de 6 toneladas para el GAD Parroquial Rural de Linares.	Este proceso se encuentra fuera del POA 2023 de la Dirección de Producción	la Dirección Financiera informa que se tiene la certificación presupuestaria, pero el proceso se encuentra en problemas ya que no existe dentro de POA 2023 de la Dir. de Producción y se sugiere que el DIRECTOR DE Producción actualice brevemente el POA para que se pueda ejecutar con la compra del vehiculo.	Con Memorando No. 0699-2023-UJM con fecha 07 de diciembre remiten especificaciones técnicas para la adquisición de un vehiculo de carga pesada de 6 toneladas	no pasa al pca 2024., no hay avance en proceso administrativo.	PRODUCCIÓN			20%	20%	20%	51%	0%	0%	0%
ARCHIDONA	COTUNDO	1	compra de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Mercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	Se adjudico la compra, pendiente la entrega de los bienes	TALLERES: Ing. Erick Córdova			40%	40%	40%	75%	99%	0%	100%
	HATUN SUMACCO	1	compra de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Mercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	Se adjudico la compra, pendiente la entrega de los bienes	TALLERES: Ing. Erick Córdova			40%	40%	40%	75%	99%	0%	100%
	SAN PABLO	1	compra de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Mercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	Se adjudico la compra, pendiente la entrega de los bienes	TALLERES: Ing. Erick Córdova			40%	40%	40%	75%	99%	0%	100%
		1	Adquisición de un camion mediano de 3.7 toneladas	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Desde los Talleres aún no envían los procesos de adquisición de camionetas, volquetas, maquinaria pesada	Proceso que no esta destinado a ninguna Dirección.	no consta, averiguar en las diferentes Direcciones	TALLERES: Ing. Adres Cabrera			20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%

CANTONES	PARROQUIAS	N°	PROYECTOS A EJECUTARSE 2023	INGRESO DE DOC. OFICIALES	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES DE NOVIEMBRE	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES DE DICIEMBRE	TEC. RESPONSABLE	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO		MESES					% PRESUPUESTARIO	% AVANCE FÍSICO
									Ejecución	Ejecución con problema	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC		
									0%	100%							
TENA	PUERTO NAPO	1	Adquisición de una excavadora 320	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Mercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	Etapa preparatoria	TALLERES: Ing. Christian Martinez			40%	40%	40%	75%	99%	0%	0%
		1	Adquisición de una volqueta tipo mula	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Mercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	Se adjudico la compra, pendiente la entrega de los bienes	TALLERES: Ing. Erick Córdova			40%	40%	40%	75%	99%	0%	100%
	PUERTO MSAHUALLI	1	Adquisición de una volqueta tipo mula	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Mercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	Se adjudico la compra, pendiente la entrega de los bienes	TALLERES: Ing. Erick Córdova			40%	40%	40%	75%	99%	0%	100%
		1	Adquisición de una Gallineta	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Mercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	Etapa preparatoria	TALLERES: Ing. Christian Martinez			40%	40%	40%	75%	99%	0%	0%
	AHLJANO	1	Adquisición de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Mercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	Se adjudico la compra, pendiente la entrega de los bienes	TALLERES: Ing. Erick Córdova			40%	40%	40%	75%	99%	0%	100%
		1	Adquisición de excavadora 320	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Mercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	Etapa preparatoria	TALLERES: Ing. Christian Martinez			40%	40%	40%	75%	99%	0%	0%
	CHONTA PUNTA	1	Adquisición de excavadora 312	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Mercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	Etapa preparatoria	TALLERES: Ing. Christian Martinez			40%	40%	40%	75%	99%	0%	0%
		1	Adquisición de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Mercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	Se adjudico la compra, pendiente la entrega de los bienes	TALLERES: Ing. Erick Córdova			40%	40%	40%	75%	99%	0%	100%
		1	Adquisición de un remolque tipo cama baja	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Desde los Talleres aún no envían los procesos de adquisicion de camionetas, volquetas, maquinaria pesada	Esta dada de baja por parte de la Dirección Financiera por el nombre técnico que no era el indicado	Esta dada de baja por parte de la Dirección Financiera por el nombre técnico que no era el indicado	TALLERES: Ing. Adres Cabrera			20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%
	PANO	1	Adquisición de un excavadora 320	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Mercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	Etapa preparatoria	TALLERES: Ing. Christian Martinez			40%	40%	40%	75%	99%	0%	0%
	TALAG	1	Adquisición de una excavadora 320	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Mercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	Etapa preparatoria	TALLERES: Ing. Christian Martinez			40%	40%	40%	75%	99%	0%	0%

CANTONES	PARROQUIAS	N°	PROYECTOS A EJECUTARSE 2023	INGRESO DE DOC. OFICIALES	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES DE NOVIEMBRE	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES DE DICIEMBRE	TEC. RESPONSABLE	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO		MESES					% PRESUPUESTARIO	% AVANCE FÍSICO
									Ejecución	Ejecución con problema	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC		
AROSEMENA TOLA	AROSEMENA TOLA	1	Adquisición de una camioneta	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Desde los Talleres aún no envían los procesos de adquisición de camionetas, volquetas, maquinaria pesada	Esta con Certificación en Compras Públicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023		TALLERES: Ing. Adres Cabrera			20%	20%	20%	75%	99%	0%	0%
		1	Adquisición de una forgoneta capacidad 21 pasajeros	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Desde los Talleres aún no envían los procesos de adquisición de camionetas, volquetas, maquinaria pesada			TALLERES: Ing. Christian Pico			20%	20%	20%	75%	99%	0%	0%
		1	Adquisición de vehículo tipo camión doble cabina	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Desde los Talleres aún no envían los procesos de adquisición de camionetas, volquetas, maquinaria pesada	Desde los Talleres aún no envían los procesos de adquisición de camionetas, volquetas, maquinaria pesada	Etapa preparatoria	TALLERES: Ing. Christian Pico			20%	20%	20%	75%	99%	0%	0%


5.1 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y TALLERES

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	SEMAFORIZACIÓN		% PRESUPUES	% AVANCE FÍSICO
	Eficiencia	Eficacia		
De 71% a 100%	X			
De 51% a 70%				
De 0% a 49%		X	0%	45%

Eficiencia avance de los proyectos; avance de los proyectos el 91%, gasto del presupuesto 0%.

Eficacia avance físico; avance de la acción física de los proyectos 43%.

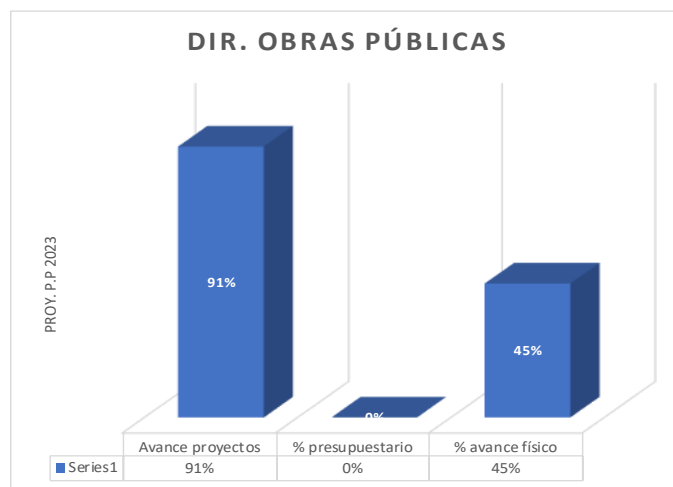


5.2 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	SEMAFORIZACIÓN		% PRESUPUES	% AVENCE FÍSICO
	Eficiencia	Eficacia		
De 71% a 100%				
De 51% a 70%				
De 0% a 49%	X	X	0	0

Eficiencia avance de los proyectos; avance de los proyectos el 15%, gasto del presupuesto 0%.

Eficacia avance físico; avance de la acción física de los proyectos 0%.

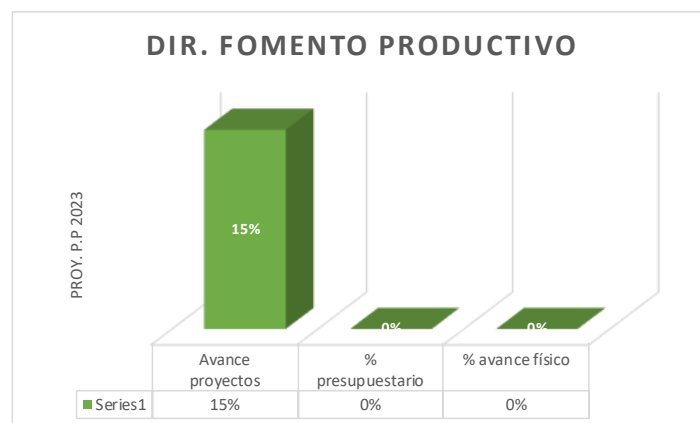


5.4 DIRECCIÓN DE NACIONALIDADES Y TURISMO

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	SEMAFORIZACIÓN		% PRESUPUES	% AVENCE FÍSICO
	Eficiencia	Eficacia		
De 71% a 100%				
De 51% a 70%				
De 0% a 49%	X	X	0	0

Eficiencia avance de los proyectos; avance de los proyectos el 20%, gasto del presupuesto 0%.


Eficacia avance físico; avance de la acción física de los proyectos 0%.

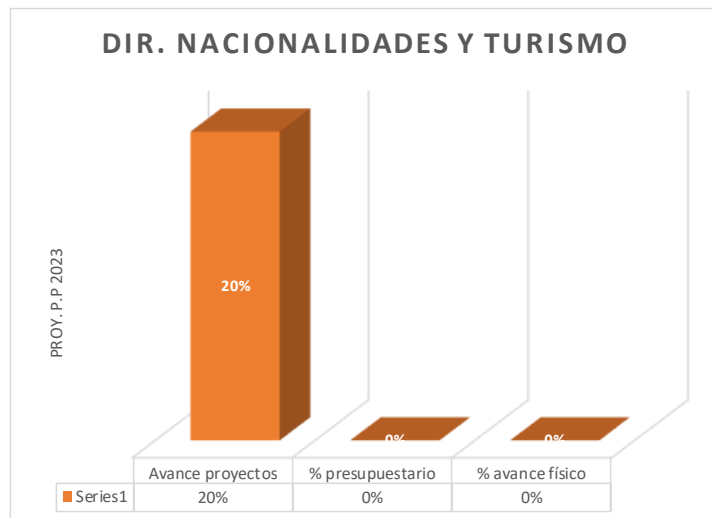

6. AVANCE DE LOS PROYECTOS DE CADA DIRECCIÓN

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

DIRECCIONES	AVANCE DE PROY.	% PRESUPUESTARIO	% AVANCE FÍSICO
Dir. OO. PP	91%	0%	45%
Dir. FOMENTO P	15%	0%	0%
Dir. NACIONALIDADES Y TURISMO	20%	0%	0%

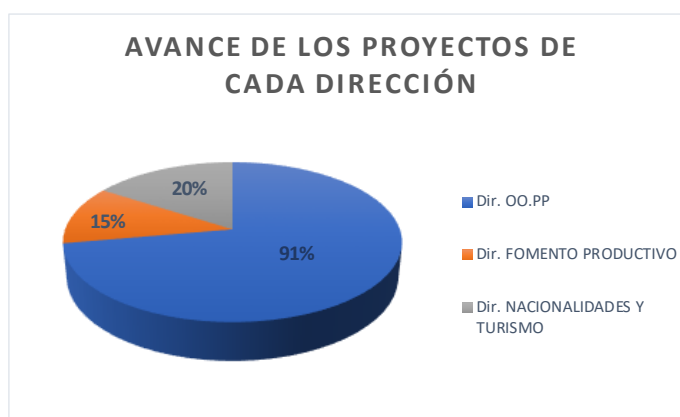

Actualmente se cuenta con 37 proyectos del Presupuesto Participativo del 2023, distribuidos por cada Dirección solo se ha avanzado el 42% de avance, existiendo problemas muy graves de ejecución.

7. CONCLUSIONES

De acuerdo al seguimiento y evaluación del Presupuesto Participativo 2023 desde el mes de agosto hasta diciembre, se tienen las siguientes conclusiones:

- La **Dirección de Obras Públicas** actualmente cuenta con 29 proyectos del P.P2023 que corresponden a 9 proyectos de apertura/lastrado, mantenimientos y construcción de infraestructura y 20 proyectos de compra de maquinaria pesada y liviana, el avance de los proyectos es del 91%, gastos presupuestarios a los proyectos el 0% y el avance físico 45%.
- La **Dirección de Obras Públicas** actualmente cuenta con 20 proyectos que corresponden a compra de maquinaria pesada y liviana, en la cual hay 9 proyectos con avance físico del 45%. (maquinaria adquirida)
- En la **Dirección de Fomento Productivo** actualmente cuenta con 5 proyectos del P.P2023 que corresponden a 4 proyectos de estudios, mantenimiento, construcción y mejoramiento, 1 proyecto de Adquisición de un vehículo, el avance de los proyectos es del 15%, gastos presupuestarios a los proyectos el 0% y el avance físico 0%.
- En la **Dirección de Nacionalidades y Turismo** actualmente cuenta con 3 proyectos del P.P2023 que corresponden a Repotenciación, reparación/mantenimiento y fortalecimiento turístico, el avance de los proyectos es del 20%, gastos presupuestarios a los proyectos el 0% y el avance físico 0%.
- De los 37 proyectos del P.P 2023 en total solo se ha avanzado ● el 42%, eso quiere decir que tenemos problemas en la ejecución de los proyectos.



8. RECOMENDACIONES

- Se debe tomar en cuenta que cada dirección tiene técnicos responsables para la ejecución de los proyectos del Presupuesto Participativos 2023, sin embargo, si uno de los responsables no ha cumplido la planificación, el nivel de cumplimiento recae en toda la dirección.
- Los directores son los primeros responsables de ejecutar lo planificado por cada una sus direcciones, y son el primer filtro para saber si están caminando o van con retraso.
- Hace falta por parte de los equipos técnicos una comprensión y cálculo real de lo que significa el proceso de un proyecto P.P , es decir, hay que planificar los que se puedan realizar en el marco de un año y que no dependan de procesos o instituciones externos para su realización así lo fuera, se debe calcular los tiempos que demandan los trámites o entrega

de Proyectos, documentos de expropiación, estudios de suelo etc. ya que al empezar muy tarde el proceso de un proyecto, éste no se va a concluir, precisamente, por empezar su ejecución con retraso.

- Las Juntas Parroquiales también tienen responsabilidad de la mala ejecución de los proyectos, ya que entregan los documentos, proyectos, etc. en destiempo pese a que se ha firmado compromisos.

Fecha: Tena, 14 de febrero de 2024

Elaborado por:	Firma
<p>Tec. Lenin Satama Técnico de Participación Ciudadana</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LENIN PATRICIO SATAMA BALLESTEROS</p>
<p>Revisado y Aprobado por:</p>	
<p>Mgts. Tholomeo Cortéz Subdirector de Participación C.</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: THOLOMEO CORTEZ AUCAY</p>

9. ANEXOS

- Matriz de Seguimiento y evaluación del P.P 2023.
- Fotos.
- Cedula Presupuestaria del 31 de diciembre de 2023.
- Actas de seguimiento.



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO
SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-INFORME No.1

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Saldo Asig Dev	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Saldo Asig Dev	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
10	ADMINISTRACION GENERAL	3.238.670,56	117.059,99	3.121.610,57	1.831.793,52	1.831.793,52	1.289.817,05	1.787.065,27	1.787.065,27	1.334.545,30	1.786.899,95	1.786.899,95	1.289.817,05	1.334.545,30
	10.01	SIN PROYECTO			143.603,00	143.702,51	130.513,07	13.189,44	130.513,07	13.189,44	130.609,79	130.609,79	13.189,44	13.189,44
	10.01	SIN PROYECTO			143.603,00	143.702,51	130.513,07	13.189,44	130.513,07	13.189,44	130.609,79	130.609,79	13.189,44	13.189,44
	10.01	GASTO EN PERSONAL			143.603,00	143.702,51	130.513,07	13.189,44	130.513,07	13.189,44	130.609,79	130.609,79	13.189,44	13.189,44
	5100	REMUNERACIONES BASICAS			106.998,36	106.998,36	100.343,75	6.654,61	100.343,75	6.654,61	100.440,47	100.440,47	6.654,61	6.654,61
	5100	REMUNERACIONES UNIFICADAS			106.998,36	106.998,36	100.343,75	6.654,61	100.343,75	6.654,61	100.440,47	100.440,47	6.654,61	6.654,61
	5100	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS			11.222,83	11.222,83	10.041,96	1.280,36	10.041,96	1.280,36	10.041,96	10.041,96	1.280,36	1.280,36
	10.01	DECI-MOCTAVO SUELO			9.097,32	9.097,32	8.110,26	987,06	8.110,26	987,06	8.110,26	8.110,26	987,06	987,06
	10.01	DECI-MOCTAVO SUELO			9.097,32	9.097,32	8.110,26	987,06	8.110,26	987,06	8.110,26	8.110,26	987,06	987,06
	10.01	DECI-MOCTAVO SUELO			2.125,51	2.125,51	1.931,70	293,3	1.931,70	293,3	1.931,70	1.931,70	293,3	293,3
	5100	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			21.381,83	21.381,83	18.740,98	2.640,85	18.740,98	2.640,85	18.740,98	18.740,98	2.640,85	2.640,85
	10.01	APORTE PATRONAL			12.465,20	12.465,20	11.690,10	775,2	11.690,10	775,2	11.690,10	11.690,10	775,2	775,2
	10.01	APORTE PATRONAL			12.465,20	12.465,20	11.690,10	775,2	11.690,10	775,2	11.690,10	11.690,10	775,2	775,2
	10.01	FONDOS DE RESERVA			8.916,21	8.916,21	7.050,88	1.865,65	7.050,88	1.865,65	7.050,88	7.050,88	1.865,65	1.865,65
	5100	INDENIZACIONES			4.000,00	4.000,00	3.386,38	2.613,62	3.386,38	2.613,62	3.386,38	3.386,38	2.613,62	2.613,62
	10.01	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESAR			4.000,00	4.000,00	3.386,38	2.613,62	3.386,38	2.613,62	3.386,38	3.386,38	2.613,62	2.613,62
	2	VICERECRETARÍA			95.936,88	1.549,09	97.485,97	90.505,39	90.505,39	90.505,39	90.505,39	90.505,39	90.505,39	90.505,39
	001	SIN PROYECTO			95.936,88	1.549,09	97.485,97	90.505,39	90.505,39	90.505,39	90.505,39	90.505,39	90.505,39	90.505,39
	001	GASTO EN PERSONAL			95.936,88	1.549,09	97.485,97	90.505,39	90.505,39	90.505,39	90.505,39	90.505,39	90.505,39	90.505,39
	5100	REMUNERACIONES BASICAS			71.172,48	0	71.172,48	71.044,23	71.044,23	71.044,23	71.044,23	71.044,23	128,25	128,25
	5100	REMUNERACIONES UNIFICADAS			71.172,48	0	71.172,48	71.044,23	71.044,23	71.044,23	71.044,23	71.044,23	128,25	128,25
	10.02	DECI-MOCTAVO SUELO			7.004,04	1.396,21	8.400,25	6.828,96	6.828,96	1.571,29	6.828,96	6.828,96	1.571,29	1.571,29
	10.02	DECI-MOCTAVO SUELO			7.004,04	1.396,21	8.400,25	6.828,96	6.828,96	1.571,29	6.828,96	6.828,96	1.571,29	1.571,29
	10.02	DECI-MOCTAVO SUELO			1.036,67	458,23	1.475,00	897,5	897,5	577,5	897,5	897,5	577,5	577,5
	5100	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			14.260,36	152,88	14.413,24	10.880,58	10.880,58	3.532,66	10.880,58	10.880,58	3.532,66	3.532,66
	10.02	APORTE PATRONAL			8.314,98	0	8.314,98	8.292,25	8.292,25	22,73	8.292,25	8.292,25	22,73	22,73
	10.02	FONDOS DE RESERVA			5.945,38	152,88	6.098,26	2.588,33	2.588,33	3.509,93	2.588,33	2.588,33	3.509,93	3.509,93
	5100	INDENIZACIONES			3.500,00	0	3.500,00	1.751,62	1.751,62	1.748,38	1.751,62	1.751,62	1.748,38	1.748,38
	10.02	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESAR			3.500,00	0	3.500,00	1.751,62	1.751,62	1.748,38	1.751,62	1.751,62	1.748,38	1.748,38
	3	SECRETARIA DE PREFECTURA			80.688,67	1.922,39	82.611,06	76.683,65	76.683,65	5.927,41	76.683,25	76.683,25	5.927,41	5.927,41
	001	SIN PROYECTO			80.688,67	1.922,39	82.611,06	76.683,65	76.683,65	5.927,41	76.683,25	76.683,25	5.927,41	5.927,41
	001	GASTO EN PERSONAL			80.688,67	1.922,39	82.611,06	76.683,65	76.683,65	5.927,41	76.683,25	76.683,25	5.927,41	5.927,41
	5100	REMUNERACIONES BASICAS			60.800,96	0	60.800,96	57.655,09	57.655,09	2.945,87	57.655,09	57.655,09	2.945,87	2.945,87
	5100	REMUNERACIONES UNIFICADAS			60.800,96	0	60.800,96	57.655,09	57.655,09	2.945,87	57.655,09	57.655,09	2.945,87	2.945,87
	5100	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS			6.024,89	1.721,03	7.745,92	6.463,32	6.463,32	1.282,60	6.462,92	6.462,92	1.282,60	1.282,60
	10.03	DECI-MOCTAVO SUELO			5.067,35	903,57	5.970,92	5.365,70	5.365,70	605,22	5.365,70	5.365,70	605,22	605,22
	10.03	DECI-MOCTAVO SUELO			5.067,35	903,57	5.970,92	5.365,70	5.365,70	605,22	5.365,70	5.365,70	605,22	605,22
	10.03	DECI-MOCTAVO SUELO			957,54	817,46	1.775,00	1.097,62	1.097,62	677,38	1.097,62	1.097,62	677,38	677,38
	5100	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.062,82	496,5	13.563,22	9.968,66	9.968,66	1.397,66	9.968,66	9.968,66	1.397,66	1.397,66
	10.03	APORTE PATRONAL			7.060,02	106	7.166,02	6.540,13	6.540,13	625,89	6.540,13	6.540,13	625,89	625,89
	10.03	FONDOS DE RESERVA			5.002,80	402,5	5.405,30	4.828,53	4.828,53	771,77	4.828,53	4.828,53	771,77	771,77

Cédula presupuestaria del 31 de diciembre de 2023

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo
SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTA DE LAS REUNIONES DE TRABAJO N° 7
SEGUIMIENTO DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO N° 7
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA UNIDAD REQUERENTE: DIANA CONSTANTE CARGO: Auxiliar 2
COMUNIDAD/INSTITUCIÓN: GAD NAPO - DIR. DE PP. FECHA: 02/11/2023
CELULAR: 0987654321 PARRQUIA: Tena CANTÓN: Tena PROVINCIA: Napo
TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO U OBRA: JUAN DIANA CONSTANTE
OBJETIVO: SEGUIMIENTO PATRISTICO PARTICIPATIVO 2023
1) MANTENIMIENTO PUENTE PATRONAL RIO SARDINAS GRANDE SECTOR EL ANILLO.
2) SEGUIMIENTO: ESTE PROYECTO SE INICIAVA Y SE INICIARON PARA SOLICITAR PUBLICIDAD A LA SISTEMA DUS AUTORIZA Y CATE LA COMISION (MEMORANDUM N° 2430-2023 -DR CONF 2023-20 -11-2023)

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo
SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTA DE LAS REUNIONES DE TRABAJO N° 11
SEGUIMIENTO DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO N° 11
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA UNIDAD REQUERENTE: DAVID KARLOL CARGO: Auxiliar 2
COMUNIDAD/INSTITUCIÓN: GAD NAPO - DIR. PLANIFICACIÓN FECHA: 02/11/2023
CELULAR: 0987654321 PARRQUIA: Tena CANTÓN: Tena PROVINCIA: Napo
TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO U OBRA: ENL DAVO BENEVOLO
OBJETIVO: SEGUIMIENTO PATRISTICO PARTICIPATIVO 2023
1) SEGUIMIENTO Y OBRAS DEL PUENTE PATRONAL EN LA COMUNIDAD ANILLO LA VICTORIA, PARRQUIA DE MATAO
2) SEGUIMIENTO Y SE HA DE RESISTENCIA CAMBIO DE EXPEDIR SE HA DE UN INFORME DE SUSPENSIÓN EL DIA MARTES 05 DE JULIO 2023

GAD PROVINCIAL NAPO Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo
ADMINISTRACIÓN 2023-2027

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA DE LAS REUNION DE TRABAJO N°:	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO N°:
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA UNIDAD REQUERIENTE	MARILSA CHAMBA CARGO ANALISTA Z
COMUNIDAD/INSTITUCION	GRUPO BOU NAPO - DIA PRODUCCION
FECHA	21/11/2023
CELULAR	0995679597
PARRQUIA	TENA
CANTÓN	TENA
PROVINCIA	NAPO
TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO U OBRA	JUV. MARILSA CHAMBA
OBJETIVO	SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

DESARROLLO

1) SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO FINAL DE LA ZONA PAHO DE CUYUTA - CANTÓN QUITO.

NO SE REALIZÓ EN EL TÉRMINO DE FINANCIA DEL PROYECTO UNA FASE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, NO SE HA REALIZADO MONITOREO DEL PROYECTO YA QUE LA UNIDAD REQUERIENTE NO HA REALIZADO EN LA ZONA PAHO Y EN LA ZONA P. CONTA CON UNO DE LOS MONITORES DEL PROYECTO SE REALIZÓ UNA REUNIÓN CON LOS MONITORES DEL PROYECTO PARA MONITOREAR Y EVALUAR EL PROYECTO EN EL TÉRMINO DE FINANCIA DEL PROYECTO Y NO MONITOREAR EN EL TÉRMINO DE FINANCIA DEL PROYECTO Y NO MONITOREAR EN EL TÉRMINO DE FINANCIA DEL PROYECTO.

ACUERDOS/COMPROMISOS

EL GRUPO BOU NAPO SE COMPROMETE A UNO DE LOS MONITORES DEL PROYECTO EN EL TÉRMINO DE FINANCIA DEL PROYECTO PARA MONITOREAR Y EVALUAR EL PROYECTO EN EL TÉRMINO DE FINANCIA DEL PROYECTO.

GAD PROVINCIAL NAPO Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo
ADMINISTRACIÓN 2023-2027

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA DE LAS REUNION DE TRABAJO N°:	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO N°:
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA UNIDAD REQUERIENTE	JUAN FRUTOS CARGO ANALISTA Z
COMUNIDAD/INSTITUCION	GAD NAPO - DIA NACIONAL DE LOS TURISTAS
FECHA	21/11/2023
CELULAR	
PARRQUIA	TENA
CANTÓN	TENA
PROVINCIA	NAPO
TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO U OBRA	JUV. JUAN FRUTOS
OBJETIVO	SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

DESARROLLO

1) REUNIÓN DE MONITOREO DEL PROYECTO FINAL DE LA ZONA PAHO DE CUYUTA - CANTÓN QUITO.

SE REALIZÓ EN EL TÉRMINO DE FINANCIA DEL PROYECTO UNA FASE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, NO SE HA REALIZADO MONITOREO DEL PROYECTO YA QUE LA UNIDAD REQUERIENTE NO HA REALIZADO EN LA ZONA PAHO Y EN LA ZONA P. CONTA CON UNO DE LOS MONITORES DEL PROYECTO SE REALIZÓ UNA REUNIÓN CON LOS MONITORES DEL PROYECTO PARA MONITOREAR Y EVALUAR EL PROYECTO EN EL TÉRMINO DE FINANCIA DEL PROYECTO.

ACUERDOS/COMPROMISOS

EL GRUPO BOU NAPO SE COMPROMETE A UNO DE LOS MONITORES DEL PROYECTO EN EL TÉRMINO DE FINANCIA DEL PROYECTO PARA MONITOREAR Y EVALUAR EL PROYECTO EN EL TÉRMINO DE FINANCIA DEL PROYECTO.

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA DE LAS REUNION DE TRABAJO N°:	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO N°:
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA UNIDAD REQUERIENTE	JOSÉ YANIZ DÍEGO PONCE CARGO ANALISTA Z
COMUNIDAD/INSTITUCION	GAD NAPO - DIA OD PP
FECHA	21/11/2023
CELULAR	0998997020
PARRQUIA	TENA
CANTÓN	TENA
PROVINCIA	NAPO
TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO U OBRA	JUV. DÍEGO PONCE - JUV. JOSÉ YANIZ
OBJETIVO	SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

DESARROLLO

1) APERTURA Y CERRAMIENTO DE VÍAS DESDE LA COMUNIDAD PITAYACU HASTA LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS ESCALON ROMY DE 3 KM.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EL DISEÑO DE VÍAS, SE ESTARÍA ELABORANDO LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PERMISO AMBIENTAL, SE COPIÓ DE LA MINA Y LUGAR PARA LA FACTIBILIDAD EN LA DIA DE PLANIFICACIÓN.

ACUERDOS/COMPROMISOS

SE ENCOMENDARÁ A LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL PROYECTO FINAL.

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA DE LAS REUNION DE TRABAJO N°:	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO N°:
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA UNIDAD REQUERIENTE	JOSÉ YANIZ DÍEGO PONCE CARGO ANALISTA Z
COMUNIDAD/INSTITUCION	GAD NAPO - DIA OD PP
FECHA	21/11/2023
CELULAR	0998997020
PARRQUIA	TENA
CANTÓN	TENA
PROVINCIA	NAPO
TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO U OBRA	JUV. DÍEGO PONCE - JUV. JOSÉ YANIZ
OBJETIVO	SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

DESARROLLO

1) APERTURA Y CERRAMIENTO DE VÍAS DESDE LA COMUNIDAD PITAYACU HASTA LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS ESCALON ROMY DE 3 KM.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EL DISEÑO DE VÍAS, SE ESTARÍA ELABORANDO LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PERMISO AMBIENTAL, SE COPIÓ DE LA MINA Y LUGAR PARA LA FACTIBILIDAD EN LA DIA DE PLANIFICACIÓN.

ACUERDOS/COMPROMISOS

SE ENCOMENDARÁ A LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL PROYECTO FINAL.

GAD PROVINCIAL **NAPO**
 Gobierno Autónomo Descentralizado
 Provincial de Napo
 ADMINISTRACIÓN 2023-2027

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA DE LAS REUNION DE TRABAJO N°:	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO N° 14
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA UNIDAD REQUERIENTE	DAIANA BALLESTE CARGO ANALISTA 3
COMUNIDAD/INSTITUCION	COMUNIDAD - UDA 02
FECHA	21-12-2023
CELULAR	
PARRQUIA	TENA
CANTÓN	TENA
PROVINCIA	NAPO
TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO U OBRA	ING. PAULINA BALLESTE
OBJETIVO	SEGUIMIENTO AL PROYECTO PARTICIPATIVO 2023 DESARROLLO

1) CAMBIO DEL COSTO ESTIMADO DE LA RAMBLA DE LA PROYECTA DENTRO DEL PLAN DE OBRAS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

SEGUIMIENTO: SE PUEDE VER EN ESTE MOMENTO QUE EL PROCESO DE LOS EXPEDIENTES, TODA LA INFORMACIÓN DE RECURSOS Y OBLIGACIONES ASOCIADAS A ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN SU ESTADO.

ACUERDOS/COMPROMISOS
 A SE REANUDA A LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL PROYECTO FINAL Y A REANUDARSE EN SU ESTADO.

GAD PROVINCIAL **NAPO**
 Gobierno Autónomo Descentralizado
 Provincial de Napo
 ADMINISTRACIÓN 2023-2027

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA DE LAS REUNION DE TRABAJO N°:	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO N° 9
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA UNIDAD REQUERIENTE	JUAN LLAMA CARGO ANALISTA 3
COMUNIDAD/INSTITUCION	COMUNIDAD - DIA PRODUCCION
FECHA	23/11/2023
CELULAR	
PARRQUIA	TENA
CANTÓN	TENA
PROVINCIA	NAPO
TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO U OBRA	ING. JUAN LLAMA
OBJETIVO	SEGUIMIENTO PROYECTO PARTICIPATIVO 2023 DESARROLLO

1) ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE EXPOSICIONES PRODUCTIVAS PARA EL CAPP DE SAN PROMISER DE BONTA.

SEGUIMIENTO: SE ENCUENTRA EN ESTE MOMENTO QUE EL PROCESO DE EXPEDIENTES EN LOS PLANIFICACION Y RESPONSABILIDAD JURIDICA, EN ESTADO DE SER DECRETADO APLICANTE UN SE PUEDE PLANEAR CON EL PROYECTO.

ACUERDOS/COMPROMISOS
 SE REANUDA A LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL PROCESO DEL PROYECTO.

GAD PROVINCIAL **NAPO**
 Gobierno Autónomo Descentralizado
 Provincial de Napo
 ADMINISTRACIÓN 2023-2027

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA DE LAS REUNION DE TRABAJO N°:	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO N° 2
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA UNIDAD REQUERIENTE	DAISY MONTESDEACA CARGO ANALISTA 3
COMUNIDAD/INSTITUCION	COMUNIDAD PROY. NAPO - DIA PRODUCCION
FECHA	20/11/2023
CELULAR	
PARRQUIA	TENA
CANTÓN	TENA
PROVINCIA	NAPO
TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO U OBRA	ING. DAISY MONTESDEACA
OBJETIVO	SEGUIMIENTO AL PROYECTO PARTICIPATIVO 2023 DESARROLLO

1) CONSTRUCCIÓN DE UNA RAMBLA PROYECTADA DE TRUCHAS PARA CAPP. OYA CACHI, CANTÓN CACHA.

SEGUIMIENTO: EN LA JUNTA P. OYA CACHI SE MANTUVO UNA REUNION DE LA JUNTA P. OYA CACHI, CONCURSARON CON RECURSOS AUTOSOL Y COMPROMISO - LA JUNTA P. SE COMPROMETE A ESCALTAZAR LAS SITUACIONES DEL PROYECTO - OBTENCION Y AJUSTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO - SE REANUDA UN A MOTIVAR UNA REUNION CON LA SUBDIRECCION SIMILAR PARA VERIFICAR DEL PROYECTO PARTICIPATIVO 2023 DESARROLLO.

ACUERDOS/COMPROMISOS
 COMPROMISO SOBRE LOS RECURSOS SE PUEDE VER EN ESTE MOMENTO, INICIARIA CON RECURSOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PARTICIPATIVO Y CUANDO SE COMIENZA A EJECUTAR LAS SITUACIONES DEL PROYECTO PARTICIPATIVO (RECURSOS AUTOSOL Y PROY. PARTICIPATIVO).

GAD PROVINCIAL **NAPO**
 Gobierno Autónomo Descentralizado
 Provincial de Napo
 ADMINISTRACIÓN 2023-2027

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA DE LAS REUNION DE TRABAJO N°:	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO N° 29
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA UNIDAD REQUERIENTE	Cecilia Balar CARGO ANALISTA DE UNIDAD DE VALORACIÓN
COMUNIDAD/INSTITUCION	COMUNIDAD PROY. NAPO - DIA PRODUCCION
FECHA	20/11/2023
CELULAR	
PARRQUIA	TENA
CANTÓN	TENA
PROVINCIA	NAPO
TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO U OBRA	ING. CECILIA BALAR
OBJETIVO	SEGUIMIENTO AL PROYECTO PARTICIPATIVO 2023 DESARROLLO

1) Mantenimiento del Puerto Comunal sobre el Puente de la Comunidad Comuna contra Oroya.

SEGUIMIENTO: El proceso se encuentra publicado bajo el número MCO-02023-2023-001. El Compras y Contratación se realiza lo siguiente: Fecha de lanzamiento adjudicación: 20/11/2023.

2) Mantenimiento sobre el Puente Comunal sobre el río Comuna contra los Organismos de la Comunidad Comuna contra Oroya.

SEGUIMIENTO: Se realizó el presupuesto N° 1116-02023-001 de fecha 16 de Octubre de 2023, en la cual se concluye que no es procedente realizar el Mantenimiento (Importe \$ 130,000).

ACUERDOS/COMPROMISOS
 Se realizó el presupuesto N° 2116-02023-001 de fecha 16 de Octubre de 2023, se ha concluido el proceso de publicación del proceso.

Se reanuda a la Subdirección de Participación Ciudadana sobre el proceso de publicación y adjudicación de los recursos a la Oroya y el mantenimiento del puente Comunal sobre el río - Puente (11.10.2023).

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

Informe de Seguimiento y Evaluación de los Proyectos del Presupuesto Participativo 2023 NOVIEMBRE/DICIEMBRE

INDICE

Tabla de contenido

1. Introducción	3
2. Objetivo	3
3. Definiciones	3
4. Metodología	5
5. Seguimiento y Evaluación de los Proyectos del Presupuesto Participativo 2023.	6
5.1 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.....	11
5.2 SUBDIRECCIÓN DE TALLERES	11
5.3 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	12
5.4 DIRECCIÓN DE NACIONALIDADES Y TURISMO	12
5.5 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	13
6. Conclusiones.....	13
7. Anexos y firma	15

1. Introducción

El Seguimiento y Evaluación es un instrumento de gestión de la planificación estratégica que se utiliza para llevar adelante el cumplimiento del Presupuesto Participativo 2023, actividades que están definidas para el cumplimiento y ejecución de los proyectos de cada área con miras a alcanzar los objetivos estratégicos de la institución.

El informe de seguimiento y evaluación del Presupuesto Participativo 2023 se enmarca en el **Art. 16. de la Ordenanza que regula la Distribución Económica del Presupuesto Participativo a nivel Territorial de la Provincia de Napo**, donde habla; *El Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Participativo se lo realizará de acuerdo al reporte de los Administradores de cada uno de los proyectos, el proceso estará a cargo de la Subdirección de Participación Ciudadana, quien generará los informes mensuales que servirán como insumo para el cumplimiento de Metas de resultado del PDYOT vigente. Además, para la realización del seguimiento y evaluación del Presupuesto participativo, el/la subdirector/a de Participación Ciudadana designará a un técnico de carrera para realizar los informes mensuales y así existiere continuidad de los mismos.*

El presente documento constituye un instrumento que permite la evaluación periódica de la gestión y, por ende, la toma de decisiones en base a las dificultades y aciertos encontrados en este ejercicio técnico.

Este trabajo se realizó con la información presupuestaria proporcionada por la Dirección Financiera, sustentos técnicos de las otras direcciones, y un cronograma de trabajo que se cumplió desde el 01 de agosto al 17 de octubre de 2023, liderado por la Subdirección de Participación Ciudadana.

El presente documento constituye un instrumento que permite la evaluación periódica de la gestión y, por ende, la toma de decisiones en base a las dificultades y aciertos encontrados en este ejercicio técnico.

2. Objetivo

Informar el avance del seguimiento correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre, mediante la presentación de resultados del seguimiento y evaluación del Presupuesto Participativo 2023

3. Definiciones

Seguimiento: Es una acción para ajustar los detalles o hacer posibles cambios en los planes según las necesidades o las condiciones coyunturales que forma el contexto de implementación del proyecto/programa. El sistema de seguimiento debe ser integrado en el trabajo cotidiano interno coordinado por las personas responsables de las actividades del proyecto.

Evaluación: Es una valoración de una acción que ocurre en un momento específico. Se puede evaluar, por ejemplo, hasta qué grado fue ejecutado con eficiencia, o hasta qué grado los objetivos y resultados fueron logrados y/o hasta qué grado el proyecto tuvo impacto en la vida de las personas.

La evaluación muchas veces requiere una visión más amplia y analítica que el propio proyecto, en donde se hace necesario reflexionar sobre el proceso en relación a dificultades y aspectos positivos que pueden afectar de diversa manera el resultado previsto.


La eficiencia: Se la define como la relación que se establece entre el **tiempo**, los **recursos** invertidos y los **logros** obtenidos. Normalmente, se dice que está siendo eficiente cuando se realiza un uso óptimo de los recursos disponibles, y se alcanzan las metas propuestas.

Eficacia: Es la relación que se establece entre las **metas logradas** y programadas, considerando los **tiempos reales** manejados en la ejecución de la acción, proyecto o actividad.

4. Metodología

La Subdirección de Participación Ciudadana, implementa una metodología propia articulada en el **Art. 16. de la Ordenanza que regula la Distribución Económica del Presupuesto Participativo a nivel Territorial de la Provincia de Napo**; se realizan los siguientes pasos:

- Se determina el porcentaje de avance que se planteó cumplir en cada uno de los proyectos o actividades, para lo cual se utiliza los rangos según la metodología de Planifica Ecuador, para la evaluación presupuestaria y física.
- Se utiliza la cédula presupuestaria de gasto.
- Se determina el estado actual del proyecto.
- Se determina los nombres de los técnicos responsables de los proyectos.
- La evaluación se realiza con los técnicos de cada dirección en fechas establecidas y acordadas (Acta).

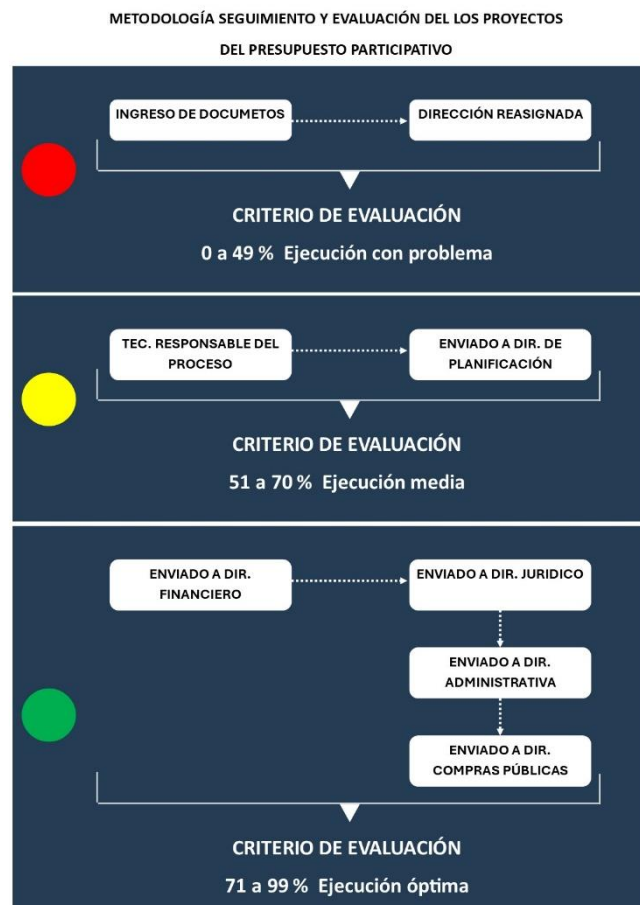

Fuente: Planifica Ecuador

5. Seguimiento y Evaluación de los Proyectos del Presupuesto Participativo 2023.

OBRAS Y ESTUDIOS (Zona alta)

CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023													
CANTONES	N°	GAD PARROQUIALES RURALES	PROYECTOS A EJECUTARSE 2023	INGRESO DE DOC. OFICIALES	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES DE NOVIEMBRE	TEC. RESPONSABLE	CRITERIO DE EVALUACIÓN		MESES			
								Ejecución Óptimo	Ejecución Media	AGOS	SEP	OCT	NOV
								Ejecución con problemas					
QUIJOS	2	COSANGA	Mantenimiento del puente carrozable sobre el río Alizo, sector Alizo.	Ingreso de oficio NO. 075-GADPRC-2023-P. GADPN-DSG-2023-2658-E.	*Esta en la Dirección de Planificación en revisión del Proyecto oportunamente enviaran a OO.PP	* El proceso se encuentra publicado bajo el No. MCD-GADPN-2023-01-01 *El cronograma y calendario fecha estimada de adjudicación 30-11-2023	OO.PP: Cesilia Escobar			25%	25%	25%	99%
			Mantenimiento del puente peatonal sobre el río Cosanga, sector Las Orquideas.	Ingreso de oficio NO. 075-GADPRC-2023-P. GADPN-DSG-2023-3569-E.	*Estan realizando el Informe Técnico para solicitar Topografía	Se emitió el Memorando No. 1126-2023-UGV de fecha 16 de octubre 2023 en el cual se concluye que no es procedente realizar en mantenimiento - presupuesto P.P \$30.000	OO.PP: Cesilia Escobar			25%	25%	25%	0%
	2	CUYUJA	Continuación del proyecto Construcción del puente peatonal sobre el río Quijos, sector Huaco - Cuyuja-Cantón Quijos.	Ingreso de oficio NO. 135-2023-GADPRC. GADPN-DSG-2023-3783-E.	*Se esta pidiendo la Factibilidad, Afectación de Predios a la Dirección de Planificación, este proceso esta donde el Arq. Diego Ramón, oportunamente enviaran a OO.PP	* El Proceso se encuentra en Compras Publicas	OO.PP: Ing. Leonardo Sanchez			25%	25%	25%	99%
			Estudio y mejoramiento del Recinto Ferial de la Junta Parroquial de Cuyuja - Cantón Quijos.	Ingreso de oficio NO. 137-2023-GADPRC. GADPN-DSG-2023-3784-E.	*Una conversación con la Presidenta de la Junta P.en el tema del Recisto ferial no se tiene elaborado el proyecto ya q menciona que no tienen el técnico para q elabore, esta solicitando q le ayuden con el proyecto a la Junta P. Cotundo para tomar como referencia y elaborar	* Se emitió un memorando No. 3386-2023-DFFD de fecha 17 de octubre 2023, donde se saca la siguiente conclusión, el proyecto no es posible continuar ya q la necesidad no es la adecuación del recisto ferial, mas bien la necesidad es la elaboración de un proyecto con enfoque turístico, en espera que se soluciones el proyecto no se podra ejecutar este año.	PRODUCCIÓN: Ing. Mariela Cayambe		5%	5%	5%	20%	
	1	PAPALLACTA	Repotenciación del Complejo turístico de aguas termales "santa Catalina", Papallacta, Cantón Quijos, provincia de Napo - Etapa 1 y contraparte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Papallacta.	Ingreso de Oficio NO. 194-GADPRP-2023	* La documentación y el proyecto esta ingresado * Aún no envían la documentación y el proyecto al Tec. responsable de la Dirección de Nacionalidades y Turismo. *Hay un problema en el presupuesto del proyecto ya que el valor no consta con lo que tiene la Sub Dirección de Presupuesto.	* Se encuentra en la Dir. de Planificación esperando la factibilidad del proyecto, de ahí se enviara a Financiero, Dir. Administrativa, Compras Públicas, se encuentra en las etapas finales.	Nacionalidades y turismo: Ing. Jhon Frutos			5%	5%	5%	70%
					Estudios para la construcción del Recinto Ferial en San Francisco de Borja - Cantón Quijos.	Ingreso de oficio NO. 048-GADPB-2023. GADPN-DSG-2023-3178-E.	*Se sigue avanzando en la elaboración de los formularios, no se puede iniciar de manera formal ya que se necesita que los predios o los terrenos le entreguen a nombre del Gad Parroquial para poder iniciar la consultoría, se tiene conocimiento q el trámite esta en etapa de expropiación en la Dirección de Planificación mientras tanto se esta adelantando, la dirección de Planificación envío a Jurídico Memo No. 1259-2023-DP para su	*Se encuentra en este momento en el proceso de expropiación del terreno, Dir. de Planificación y Jurídico, en espera de este documento habilitante mientras tanto no se puede avanzar con el proyecto.	PRODUCCIÓN: Ing. Juan Uluma		20%	20%	20%

CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023													
OBRAS Y ESTUDIOS													
CANTONES	N°	GAD PARROQUIALES RURALES	PROYECTOS A EJECUTARSE 2023	INGRESO DE DOC. OFICIALES	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES DE NOVIEMBRE	TEC. RESPONSABLE	CRITERIO DE EVALUACIÓN		MESES			
								Ejecución Óptimo	Ejecución Media	AGOS	SEP	OCT	NOV
CHACO	1	OYACACHI	Construcción de una Planta Procesadora de Truchas para el gad parroquial de Oyacachi, Cantón Chaco	Aún no ingresa el oficio el señor Presidente de la Junta	*La junta parroquial tiene q presentar el proyecto previo acuerdos pero aun no envia a la Dirección correspondiente.	*En la junta parroquial se mantuvo una reunión el 14-12-23 para exponer observaciones del proyecto presentado por el GADP Oyacachi, concluyendo acuerdos y compromisos: la junta se compromete a legalizar las escrituras del predio, reformulación y ajuste del presupuesto del proyecto. *El GADPN va a motivar una reunión con el Procurador Síndico para la explicación del procedimiento legal del Comodato, en espera de estos compromisos el proyecto se estaría ejecutando el proximo año.	PRODUCCIÓN: Dra. Daisy Montesdeoca	Ejecución con problemas		5%	5%	5%	20%
	1	SANTA ROSA	Adquisición Armeros metálicos para el GAD Parroquial Rural de Santa Rosa, cantón El Chaco (\$20.000)		*Solo se ha hecho una inspeccion para verificar los lugares donde se van a colocar	*Solo se ha hecho una inspeccion Memorando No. 2164-2023-DOP del 10 julio 2023 para verificar los lugares donde se van a colocar las alcantarillas.	OO.PP: Ing. Jose Lovato	Ejecución con problemas		10%	10%	10%	20%
	1	GONZALO DIAZ DE PINEDA	Cambio de cesped sintético para el Gad. Parroquial de Gonzalo Diaz de Pineda	Acta de Socialización del 12 de octubre 2023	*Esta hecho el proyecto en su totalidad, enviaron a la Dir. De Planificación para elaborar el informe de Factibilidad, con eso pedirán la certificación presupuestaria a la Dir. Financiera y continuarán con el trámite de contratación. *Además el GadNapo se hará cargo del 100% del presupuesto asignado del proyecto	* El proyecto se encuentra listo con todos los expedientes, solo esta faltando el tema de convenios vencidos que el tiene Chaco con el GADPNAPO	OO.PP: Ing. Paulina Rodríguez	Ejecución Media		20%	20%	20%	70%
	1	SARDINAS	Construcción del Puente Peatonal colgante de logitud 47 metros sobre el río Sardinas, en la Parroquia Sardinas, Cantón El Chaco.		*El Proyecto esta en los ultimos procesos solo falta el Manual de Operación y Mantenimiento	* Se emitió el Memorando No. 1016-2023-SDEP con fecha 07-07-23 en el cual se concluye que no es procedente realizar el estudio y diseño del puente peatonal en la comunidad Anzu - la victoria, Pto. Napo.	Planificación: Ing. David Baquero-Ing. Irma Badillo	Ejecución con problemas		25%	25%	25%	0%
	1		Mantenimiento Puente Peatonal río Sardinas grande sector El Ángel, Parroquia Sardinas, Cantón El Chaco.			* Este proyecto se encuentra ya enviado para solicitar publicación, a la espera que autoricen y crean la comisión con Memorando No. 2170-2023-DA	OO.PP: Ing. Diana Constante	Ejecución Óptimo		25%	25%	25%	99%

(Zona baja)

CANTONES	N°	GAD PARROQUIALES RURALES	PROYECTOS A EJECUTARSE 2023	INGRESO DE DOC. OFICIALES	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES DE NOVIEMBRE	TEC. RESPONSABLE	CRITERIO DE EVALUACIÓN		MESES			
								Ejecución Óptimo	Ejecución Media	AGOS	SEP	OCT	NOV
								Ejecución con problemas					
TENA	1	PUERTO NAPO	Estudios para la construcción del puente turístico pasarela de la parroquia Puerto Napo, Cantón Tena. Se cambio el nombre a: "Estudio y Diseño del puente peatonal en la comunidad Anzu La Victoria, parroquia Pto. Napo"	Ingreso de oficio NO. GADPRPN-SG-NG-2023-00302-OF. GADPN-DSG-2023-3776-E. -Memorando No. 1190-2023-DP	*no hay avance por motivos de cambio de nombre del proyecto y otros aspectos técnicos	NO PROCEDE							
	2		Iluminación y Mantenimiento del puente antiguo sobre el río Napo, parroquia Pto. Napo. Se cambio el nombre a: "Adecuación del puente antiguo sobre el río Napo e implementación de iluminaria ornamental para el fortalecimiento turístico dentro de la parroquia Pto. Napo"	Ingreso de oficio NO. GADPRPN-SG-NG-2023-00302-OF. GADPN-DSG-2023-3776-E. -Memorando No. 1190-2023-DP	*no hay avance por motivos de cambio de nombre del proyecto y otros aspectos técnicos	Este proyecto se hizo cambio de nombre por tal razón se empieza desde cero todo el proceso, lamentablemente este año no se va ejecutar.	Nacionalidades y turismo: Ing. Jhon Frutos			5%	5%	5%	5%
	1	PUERTO MISAHAUAL	Convenio para operativo y combustible hasta diciembre 2023-saldo restante total del presupuesto.	Ingreso de oficio NO. 00107-GADPR-PM-2023. GADPN-DSG-2023-4124-E.	*No consta en POA de OO.PP	Se va a ejecutar con administración directa el presupuesto de Misahualli	OO.PP: No hay técnico responsable para la ejecución del Proyecto			5%	5%	5%	5%
	1	MUYUNA	Construcción del Polideportivo Etapa 1, esto se construirá mediante un convenio tripartito entre Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, Gobierno Municipal de Tena y Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan de Muyuna.	Ingreso Oficio No. 017-GADPSJM-2019-2023 de fecha 27 de junio-2023 de la Junta P.	*Esta en la Dirección de Planificación en revisión del Proyecto oportunamente envían a OO.PP	*Actualmente el proyecto esta en etapa de revisión de diseño, costos, nuevos rubros, oportunamente se enviara para q se haga el perfil del proyecto y la factibilidad y finalmente envían a OO.PP	Dir. Planificación: Ing. Diego Ramón			25%	25%	25%	60%
ARCHIDONA	1	COTUNDO	Repotenciación y Reconstrucción del Recinto Ferial y Exposiciones "Victor Toapanta" de la Parroquia de Cotundo.	Ingreso Oficio No. 406-GADPRC-2023 de fecha 05 de septiembre-2023 de la Junta P.	*Disposición para Inspección Memorando Nro. 2832-2023-DFPRD Dir. Producción Se hizo la visita del lugar * hay un error en el Nombre, en espera de las correcciones. * el predio está a nombre del gad municipal por lo que tocaria ver eso antes de cualquier intervención, además el proyecto se debe realizar bajo los lineamientos de agrocalidad, para lo cual se tendra una reunión para determinar los puntos	* En espera que el GADParroquial de Cotundo entregue la escrituras, de igual manera definir los nuevos rubros y el cambio de nombre con el objeto en Mantenimiento.	Producción: Ing. Mariela Cayambre			5%	5%	5%	20%
	1	SAN PABLO	Apertura y lastrado de vías desde la Comunidad Pitayacu hasta la Asociación de Servicios Turísticos Islawn Rummy de 3km, existe el estudio pertinente.	Ingreso Oficio No. 031-PGADPRSPU-2023 de la Junta P. (Cod. 2458-E)	* Se encuentra terminada la Topografía * Falta procesar el levantamiento para hacer plano * El estudio de suelo la Ing. Alejandra León se comprometió entregar el día jueves 12 de octubre	* El proyecto actualmente se encuentra en el diseño de vía, se estaria elaborando la documentación para el permiso ambiental, el caso de la mina y luego pedir factibilidad en la Dir. Planificación.	OO.PP: Ing. Diego Ponce-Ing. José Yanez			5%	5%	5%	20%

MAQUINARIA.

CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023														
COMPRA DE MAQUINARIA														
CANTONES	PARROQUIAS	N°	PROYECTOS A EJECUTARSE 2023	INGRESO DE DOC. OFICIALES	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES AGOSTO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES DE NOVIEMBRE	TEC. RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE			MESES			
								Ejecución Optimo	Ejecución Media	Ejecución con problemas	AGOS	SEP	OCT	NOV
CHACO	GONZALO DÍAZ DE PINEDA	1	compra de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el dia jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	TALLERES: Ing. Erick Córdova				40%	40%	40%	99%
	SANTA ROSA	1	adquisición de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el dia jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	TALLERES: Ing. Erick Córdova				40%	40%	40%	99%
	LINARES	1	adquisición de un vehiculo de capacidad de 6 toneladas para el GAD Parroquial Rural de Linares.	Este proceso se encuentra fuera del POA 2023 de la Dirección de Producción	la Dirección Financiera informa que se tiene la certificación presupuestaria, pero el proceso se encuentra en problemas ya que no existe dentro de POA 2023 de la Dir. de Producción y se sugiere que el DIRECTOR DE Produccion actualice brevemente el POA para que se pueda ejecutar con la compra del vehiculo.	Con Memorando No. 0699-2023-UMM con fecha 07 de diciembre remiten especificaciones técnicas para la adquisición de un vehiculo de carga pesada de 6 toneladas	TALLERES: Ing. Andres Cabrera				20%	20%	20%	51%
ARCHIDONA	COTUNDO	1	compra de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el dia jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	TALLERES: Ing. Erick Córdova				40%	40%	40%	99%
	HATUN SUMACO	1	compra de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el dia jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	TALLERES: Ing. Erick Córdova				40%	40%	40%	99%
	SAN PABLO	1	compra de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el dia jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	TALLERES: Ing. Erick Córdova				40%	40%	40%	99%
		1	Adquisición de un camion mediano de 3.7 toneladas	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Desde los Talleres aún no envian los procesos de adquisicion de camionetas, volquetas, maquinaria pesada	Proceso que no esta destinado a ninguna Dirección.	TALLERES: Ing. Adres Cabrera				20%	20%	20%	0%

CON SOLIDADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023															
COMPRA DE MAQUINARIA															
CANTONES	PARROQUIAS	N°	PROYECTOS A EJECUTARSE 2023	INGRESO DE DOC. OFICIALES	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES AGOSTO- SEPTIEMBRE- OCTUBRE	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES DE NOVIEMBRE	TEC. RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE			MESES				
								Ejecución Óptimo	Ejecución Media	Ejecución con problemas	AGOS	SEP	OCT	NOV	
TENA	PUERTO NAPO	1	Adquisición de una excavadora 320	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miércoles 11 de octubre hubo una reunión con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	TALLERES: Ing. Christian Martínez					40%	40%	40%	99%
		1	Adquisición de una volqueta tipo mula	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miércoles 11 de octubre hubo una reunión con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	TALLERES: Ing. Erick Córdova					40%	40%	40%	99%
	PUERTO MSAHUALLI	1	Adquisición de una volqueta tipo mula	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miércoles 11 de octubre hubo una reunión con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	TALLERES: Ing. Erick Córdova					40%	40%	40%	99%
		1	Adquisición de una Gallineta	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miércoles 11 de octubre hubo una reunión con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	TALLERES: Ing. Christian Martínez					40%	40%	40%	99%
	AHUANO	1	Adquisición de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miércoles 11 de octubre hubo una reunión con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	TALLERES: Ing. Erick Córdova					40%	40%	40%	99%
		1	Adquisición de excavadora 320	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miércoles 11 de octubre hubo una reunión con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	TALLERES: Ing. Christian Martínez					40%	40%	40%	99%
	CHONTAPUNTA	1	Adquisición de excavadora 312	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miércoles 11 de octubre hubo una reunión con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	TALLERES: Ing. Christian Martínez					40%	40%	40%	99%
		1	Adquisición de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miércoles 11 de octubre hubo una reunión con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	TALLERES: Ing. Erick Córdova					40%	40%	40%	99%
		1	Adquisición de un remolque tipo cama baja	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Des de los Talleres aún no envían los procesos de adquisición de camionetas, volquetas, maquinaria pesada	Esta dada de baja por parte de la Dirección Financiera por el nombre técnico que no era el indicado		TALLERES: Ing. Adres Cabrera					20%	20%	20%
	PANO	1	Adquisición de una excavadora 320	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miércoles 11 de octubre hubo una reunión con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	TALLERES: Ing. Christian Martínez					40%	40%	40%	99%
	TALAG	1	Adquisición de una excavadora 320	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miércoles 11 de octubre hubo una reunión con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	TALLERES: Ing. Christian Martínez					40%	40%	40%	99%

CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023														
COMPRA DE MAQUINARIA														
CANTONES	PARROQUIAS	N°	PROYECTOS A EJECUTARSE 2023	INGRESO DE DOC. OFICIALES	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO MES DE NOVIEMBRE	TEC. RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE			MESES			
								Ejecución Óptimo	Ejecución Media	Ejecución con problemas	AGOS	SEP	OCT	NOV
AROSEMENA TOLA	AROSEMENA TOLA	1	Adquisición de una camioneta	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Desde los Talleres aún no envían los procesos de adquisición de camionetas, volquetas, maquinaria pesada	Esta con Certificación en Compras Publicas con Memorando 4311-2023-DOP -12-12-2023 *Memorando 4256-2023-DOP -07-12-2023	TALLERES: Ing. Adres Cabrera				20%	20%	20%	99%
		1	Adquisición de una forgoneta capacidad 21 pasajeros	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Desde los Talleres aún no envían los procesos de adquisición de camionetas, volquetas, maquinaria pesada		TALLERES: Ing. Christian Pico				20%	20%	20%	99%
		1	Adquisición de vehículo tipo camión doble cabina	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Desde los Talleres aún no envían los procesos de adquisición de camionetas, volquetas, maquinaria pesada		TALLERES: Ing. Christian Pico				20%	20%	20%	99%

5.1 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	SEMAFORIZACIÓN	
	Eficiencia	Eficacia
De 71% a 100%		
De 51% a 70%	X	
De 0% a 49%		X

Eficiencia avance de los proyectos; 52%, su avance fue una ejecución media, en cumplimiento los meses noviembre y diciembre de 2023.

Eficacia avance físico; 0%, su avance fue con problemas, de acuerdo a números de proyectos o actividades planificadas durante los meses noviembre y diciembre de 2023.

5.2 SUBDIRECCIÓN DE TALLERES

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	SEMAFORIZACIÓN	
	Eficiencia	Eficacia
De 71% a 100%	X	
De 51% a 70%		
De 0% a 49%		X

Eficiencia avance de los proyectos; 83%, su avance fue una ejecución óptima, en cumplimiento los meses noviembre y diciembre de 2023.

Eficacia avance físico; 0%, su avance fue con problemas, de acuerdo a números de proyectos o actividades planificadas durante los meses noviembre y diciembre de 2023.

5.3 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	SEMAFORIZACIÓN	
	Eficiencia	Eficacia
De 71% a 100%		
De 51% a 70%		
De 0% a 49%	X	X

Eficiencia avance de los proyectos; 20%, su avance fue con problemas, en cumplimiento de los meses noviembre y diciembre de 2023.

Eficacia avance físico; 0%, su avance fue con problemas, de acuerdo a números de proyectos o actividades planificadas durante los meses noviembre y diciembre de 2023.

5.4 DIRECCIÓN DE NACIONALIDADES Y TURISMO

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	SEMAFORIZACIÓN	
	Eficiencia	Eficacia
De 71% a 100%		
De 51% a 70%		
De 0% a 49%	X	X

Eficiencia avance de los proyectos; 38%, su avance fue con problemas, en cumplimiento de los meses noviembre y diciembre de 2023.

Eficacia avance físico; 0%, su avance fue con problemas, de acuerdo a números de proyectos o actividades planificadas durante los meses noviembre y diciembre de 2023.

5.5 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	SEMAFORIZACIÓN	
	Eficiencia	Eficacia
De 71% a 100%		
De 51% a 70%	X	
De 0% a 49%		X

Eficiencia avance de los proyectos; 60%, su avance fue una ejecución media, en cumplimiento los meses noviembre y diciembre de 2023.

Eficacia avance físico; 0%, su avance fue con problemas, de acuerdo a números de proyectos o actividades planificadas durante los meses noviembre y diciembre de 2023.



6. Conclusiones

De acuerdo al seguimiento y evaluación del Presupuesto Participativo 2023 de los meses noviembre y diciembre, se tienen las siguientes conclusiones:

- El informe de seguimiento y evaluación del Presupuesto Participativo 2023 se da cumplimiento con el *Art. 16. de la Ordenanza que regula la Distribución Económica del Presupuesto Participativo a nivel Territorial de la Provincia de Napo.*
- La Dirección de Obras Públicas tiene una ejecución media con 52% de eficiencia y 0% eficacia.
- La Dirección de Talleres tiene una ejecución óptima con 83% de eficiencia y 0% eficacia.
- La Dirección de Fomento Productivo tiene una ejecución con problemas con 38% de eficiencia y 0% eficacia.
- La Dirección de Planificación tiene una ejecución media con 60% de eficiencia y 0% eficacia.
- En el caso de “Eficiencia” existe factores como el tiempo, no se está cumpliendo con las metas programadas
- En el caso de “Eficacia” no se está cumpliendo con las metas de la ejecución, acción, proyectos o actividades.
- Se debe tomar en cuenta que cada dirección tiene técnicos responsables para la ejecución de los proyectos del Presupuesto Participativos 2023, sin embargo, si uno de los responsables no ha cumplido la planificación, el nivel de cumplimiento recae en toda la dirección.

- Los directores y directoras son los primeros responsables de ejecutar lo planificado por cada una sus direcciones, y son el primer filtro para saber si están caminando o van con retraso. No deben esperar una evaluación mensual. Se recomienda que, si van a plantear alguna modificación, lo hagan con una comunicación oportuna.
- Hace falta por parte de los equipos técnicos una comprensión y cálculo real de lo que significa el proceso de un proyecto P.P , es decir, hay que planificar los que se puedan realizar en el marco de un año y que no dependan de procesos o instituciones externos para su realización, y si así lo fuera, se debe calcular los tiempos que demandan los trámites o entrega de Proyectos, documentos de expropiación, estudios de suelo etc. ya que al empezar muy tarde el proceso de un proyecto, éste no se va a concluir, precisamente, por empezar su ejecución con retraso.
- Las Juntas Parroquiales también tienen responsabilidad de la mala ejecución de los proyectos, ya que entregan los documentos, proyectos, etc. en destiempo pese a que se ha firmado compromisos.

Fecha: Tena, 27 de diciembre de 2023

Elaborado por:	Firma
<p>Tec. Lenin Satama Técnico de Participación Ciudadana</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LENIN PATRICIO SATAMA BALLESTEROS</p>
Revisado y Aprobado por:	
<p>Mgts. Tholomeo Cortéz Subdirector de Participación C.</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: THOLOMEO CORTEZ AUCAY</p>

7. Anexos

- Matriz de Seguimiento y evaluación del P.P 2023
- Fotos
- Cedula Presupuestaria del 30 de septiembre
- Actas de seguimiento





Gobierno Autónomo Descentralizado
 Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA DE LAS REUNION DE TRABAJO	N°:	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		N°: 7
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA UNIDAD REQUERIENTE	DIANA CONSTANTE	CARGO	ANALISTA 2	
COMUNIDAD/INSTITUCION	GADP NAPO - Din. OO. PP.			
FECHA	21/11/2023			
CELULAR	0987422792			
PARRQUOIA	TENA			
CANTÓN	TENA			
PROVINCIA	NAPO			
TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO U OBRA	ING. DIANA CONSTANTE			
OBJETIVO	SEGUIMIENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023			
DESARROLLO				
1) MANTENIMIENTO PONTE PSATONAL RIO SARDINAS GRANDES SECTOR EL ANGELO				
SEGUIMIENTO: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA YA ENVIADO PARA SOLICITAR PUBLICACION, A LA SSPNA QUE AUTORICE Y CREE LA COMISION. (MEMORANDO N° 2170-2023-DA COM F20HP 20-11-2023)				
ACUERDOS/COMPROMISOS				
* SE ENVIÓ MEMORANDO N° 2170-2023-DA. CON FECHA 20-11-2023 - SE HA ENVIADO AL SECTOR PRECISO SOLICITANDO LA AUTORIZACION PARA EL PROCESO PRE CONTRACTUAL.				
* SE INFORMARÁ A LA SUBDIRECCION PARTICIPACION CIUDADANA SOBRE EL PROCESO FINAL				

Elaborado por: Ing. Slendy Cerda

063 700 080 Ext.1028
 062 886 503

prefecturaa@napo.gob.ec
 jtoapanta@napo.gob.ec

Av. Juan Montalvo
 y Olmedo

GAD PROVINCIAL
NAPO
Juntos sí podemos!
 ADMINISTRACIÓN 2023 - 2027

Gobierno Autónomo Descentralizado
 Provincial de Napo
 ADMINISTRACIÓN 2023-2027

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA DE LAS REUNION DE TRABAJO	N°:	SEGUIMIENTO DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Y	N°: 11
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA UNIDAD REQUERIENTE	DAVID BAQUERO	CARGO	ANALISTA 2	
COMUNIDAD/INSTITUCION	GRUP NAPO - DIN PLANIFICACION			
FECHA	22/11/2023			
CELULAR	0998960337			
PARRQUIA	TENA			
CANTÓN	TENA			
PROVINCIA	NAPO			
TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO U OBRA	ING. DAVID BAQUERO			
OBJETIVO	SEGUIMIENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023			
DESARROLLO				
1) ESTUDIO Y DISEÑO DEL PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD ANZO - LA VICTORIA, PARROQUIA PRO. NAPO. SEGUIMIENTO: SE HIZO EL RESPECTIVO CAMBIO DE NOMBRE. SE HIZO UN INFORME DE INSPECCIÓN EL DÍA MARTES 05 DE JUNIO/2023 POR ASPECTOS TÉCNICOS NO ES PROCEDENTE LA EJECUCION DEL PROJ. SE EMITIO UN MEMORANDO Nº 1016 -2023 - SDIP, DE FECHA 07-07-2023 EN LA CUAL SE CONCLUYE QUE NO ES PROCEDENTE REDACTAR EL ESTUDIO Y DISEÑO DEL PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD ANZO - LA VICTORIA, PAR. DTO. NAPO.				
ACUERDOS/COMPROMISOS				
SE INFORMARÁ A LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL PROCESO FINAL				

Elaborado por: Ing. Slendy Cerda

063 700 080 Ext.1028
 062 886 503

prefectura@napo.gob.ec
 jtoapanta@napo.gob.ec

Av. Juan Montalvo y Olmedo



Gobierno Autónomo Descentralizado
 Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA DE LAS REUNION DE TRABAJO	N°:	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	N°: 14
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA UNIDAD REQUERIENTE	PAULINA RODRIGUEZ	CARGO	ANCIESTA 3
COMUNIDAD/INSTITUCION	GADPNAPO - OO. PP.		
FECHA	11-12-2022		
CELULAR			
PARRQUOIA	TENA		
CANTÓN	TENA		
PROVINCIA	NAPO		
TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO U OBRA	ING. PAULINA RODRIGUEZ		
OBJETIVO	SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023		
DESARROLLO			
1) CAMBIO DE CESPED SINTÉTICO DE LA CANCHA DE LA PARRQUOIA COMUNO DIAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO.			
SEGUIMIENTO : SE PROCESO SE ENCUENTRA LISTO CON TODOS LOS EXPEDIENTES, SOLO LES FALTA EL TEMA DE CONVENIO CONVENIOS USUARIOS QUE TIENE EL CHACO CON EL GADPNAPO.			
ACUERDOS/COMPROMISOS			
* SE TRAMITARA A LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE SU PROCESO FINAL Y RECOMENDACIONES FUTURAS.			

Elaborado por: Ing. Slendy Cerda

GAD PROVINCIAL
NAPO
 Juntos sí podemos!
 ADMINISTRACIÓN 2023 - 2027

**Gobierno Autónomo Descentralizado
 Provincial de Napo**
 ADMINISTRACIÓN 2023-2027

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA DE LAS REUNION DE TRABAJO	N°:	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	N°: 12
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA UNIDAD REQUERIENTE	JOSE LOUATO	CARGO	ANALISTA 3
COMUNIDAD/INSTITUCION	GAOP NAPO - DIR. OO.PP.		
FECHA	22/11/2023		
CELULAR			
PARRQUIA	TENA		
CANTÓN	TENA		
PROVINCIA	NAPÓ		
TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO U OBRA	ING. JOSE LOUATO		
OBJETIVO	SEGUIMIENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023. DESARROLLO		

1) ADQUISICIÓN DE ARMARIOS METÁLICOS PARA EL GADP DE SANTA ROSA, CANTÓN EL CHACO.
 SEGUIMIENTO: EL ING. RESPONSABLE DEL PROYECTO, INFORMA QUE NO SE HAN ADQUIRIDO NADA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. SÓLO EXISTE EL INFORME DE INSPECCIÓN, MEMORANDO N° 2164-2023-DOP DIR 10 JULIO/2023 (VERIFICACIÓN DE LOS LUGARES DONDE SE VAN A COLOCAR)

ACUERDOS/COMPROMISOS
 SE INFORMARÁ A LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL PROYECTO FINAL.

Elaborado por: Ing. Slendy Cerda

063 700 080 Ext.1028
 062 886 503

prefectura@napo.gob.ec
 jtoapanta@napo.gob.ec

Av. Juan Montalvo y Olmedo



Gobierno Autónomo Descentralizado
 Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA DE LAS REUNION DE TRABAJO	N°:	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	N°: 97
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA UNIDAD REQUERIENTE	Cecilia Escobar.	CARGO	Analista H/a de Unidad de Viabilidad
COMUNIDAD/INSTITUCION	Govierno Prov. Napo.		Dirección Obras Públicas
FECHA	20/11/2023.		
CELULAR	09834114074/		
PARRQUIA	Tena		
CANTÓN	Tena		
PROVINCIA	Napo		
TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO U OBRA	Ing. Cecilia Escobar.		
OBJETIVO	Seguimiento al Presupuesto Participativo 2023.		
DESARROLLO			
1) Mantenimiento del Puente Conozable sobre el Sector Alizo de la Parroquia Cosanga cantón Quijos			
Seguimiento: El proceso se encuentra publicado bajo el Número (MCO - OADP) 1-2023-0101. El Cronograma y Condiciones se indica lo siguiente. Fecha estimada de adjudicación: 30/11/2023			
2) Mantenimiento sobre el Puente Peatonal sobre el río Cosanga Sector las Orquídeas de la Parroquia Cosanga, cantón Quijos,			
Seguimiento: Se emitió el memorando N° 11-EG-2023-V01 de fecha 16 de Octubre de 2023; en la cual se concluye que NO es procedente realizar el Mantenimiento (Presupuesto PL \$ 30.000)			
ACUERDOS/COMPROMISOS			
Se emitió un memorando N° 3776-2023-DOP / de fecha 31 de Octubre / 2023; se ha enviado a la Dirección de Planificación.			
Se informó a la Subdirección Tena Ciudadana sobre el proceso final y Recomendación final a la Obra de Mantenimiento del puente Conozable sector Alizo. Hasta (11-30/2023)			

Elaborado por: Ing. Slendy Cerda



063 700 080 Ext.1028
 062 886 503



prefectura@napo.gob.ec
 jtoapanta@napo.gob.ec



Av. Juan Montalvo
 y Olmedo



Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA DE LAS REUNION DE TRABAJO	N°:	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	N°: 9
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA UNIDAD REQUERIENTE	JUAN LLUMA	CARGO	ANALISTA 3
COMUNIDAD/INSTITUCION	GADP NAPO - DIN PRODUCCION		
FECHA	22/11/2023		
CELULAR			
PARRQUIA	TENA		
CANTÓN	TENA		
PROVINCIA	NAPO		
TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO U OBRA	ING. JUAN LLUMA		
OBJETIVO	SEGUIMIENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 DESARROLLO		
<p>1) ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PERTINENTES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE EXPOSICIONES PRODUCTIVAS PARA EL GADP DE SAN FRANCISCO DE BORJA.</p> <p>SEGUIMIENTO: SE ENCUENTRA EN ESTE MOMENTO EN EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN LA DIR. DE PLANIFICACION Y PROCORADORIA JURIDICA, EN ESOSRA DE ESE DOCUMENTO HABICITANTE NO SE PUEDE AVANZAR CON EL PROYECTO.</p>			
ACUERDOS/COMPROMISOS			
SE INFORMARA A LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL PROCESO DEL PROYECTO.			

Elaborado por: Ing. Slendy Cerda

GAD PROVINCIAL
NAPO
 Juntos sí podemos!
 ADMINISTRACIÓN 2023 - 2027

Gobierno Autónomo Descentralizado
 Provincial de Napo
 ADMINISTRACIÓN 2023-2027

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA DE LAS REUNION DE TRABAJO	N°:	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	N°: 2
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA UNIDAD REQUERIENTE	DAYSI MONTESDROGA	CARGO	ANALISTA 3.
COMUNIDAD/INSTITUCION	GOBIERNO PROV. NAPO - DIR PRODUCCION		
FECHA	20/11/2023		
CELULAR			
PARRQUOIA	TENA		
CANTÓN	TENA		
PROVINCIA	NAPO		
TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO U OBRA	D.A. DAYSI MONTESDROGA.		
OBJETIVO	SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.		
DESARROLLO			
1) CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE TRUCHAS PARA GADP. OYA CACHI, CANTON CARO.			
* SEGUIMIENTO: EN LA JUNTA P. OYACACHI SE MANTUVO UNA REUNION EL 14-12-2023 PARA EXPONER OBSERVACIONES DEL PROYECTO PRESUPUESTO POR EL GADP OYACACHI, CONCLUYENDO CON ALGUNOS ACUERDOS Y COMPROMISOS.			
- LA JUNTA P. SE COMPROMETE A ESCALIONAR LAS SIGNATURAS DEL PREDIO			
- REFORMULACION Y AJUSTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO.			
- EL GADP NAPO VA A MOTIVAR UNA REUNION CON EL PROCURADOR SINDICO PARA EXPLICACION DEL PROCEDIMIENTO LEGAL DEL CONCORDATO.			
ACUERDOS/COMPROMISOS			
COMPROMISO SERIA A DESDE EL PROXIMO AÑO 2025, INICIARIA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SUSPENDIENDO Y CUANDO EL GADP PARROQUIA ESTE PRESENTE TODA LA DOCUMENTACION TECNICA (SIGNATURAS LEGALES Y PROY. AJUSTABLES).			

GAD PROVINCIAL
NAPO
Juntos sí podemos!
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2027

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo**
ADMINISTRACIÓN 2023-2027

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA DE LAS REUNION DE TRABAJO	N°:	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	N°: 3
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA UNIDAD REQUERIENTE	MARIZLA CAYAMBE	CARGO	ANALISTA 2.
COMUNIDAD/INSTITUCION	GOBIERNO POU. NAPO - DIR. PRODUCCION		
FECHA	20/11/2023		
CELULAR	0998689547		
PARRQUOIA	TSMN		
CANTÓN	TSMN		
PROVINCIA	NAPO		
TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO U OBRA	ING. MARIZLA CAYAMBE.		
OBJETIVO	SOLUCIONADO DE PASAPORTES PARTICIPATIVO 2023		
DESARROLLO			
<p>1) ESTUDIO Y RECOMENDACIONES DEL REGISTRO FERIAZ DE LA JUNTA PARRO. DE CUYUTA CANTÓN QUITO.</p> <p>NO SE ENCUENTRA EN EL TEMP. O FINALIDAD DEL PROJ. TSMN UN ENFOQUE TURISTICO Y NO PRODUCTIVO, NO SE HA PODIDO AVANZAR CON EL PROYECTO YA QUE EN LA ACTA DE P.C. CONSTA CON UN NOMBRE Y EN LA CEDULA P. CONSTA CON OTRO NOMBRE, CON DISPOSICION DEL 27-10-23 SE REALIZO UNA INSPECCION CONCLUYENDO LA NECESIDAD DE TENER UN ENFOQUE TURISTICO Y NO PRODUCTIVO, EN ESPERA DE QUE SE SOLUCIONE TODO ESTO. ESTE PROYECTO NO SE PODRA EJECUTAR SIN ESTO.</p>			
ACUERDOS/COMPROMISOS			
<p>EL GADP CUYUTA SE COMPROMETE UNA VEZ SE EJECUTADO LA REUNION, RESPONDER LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DEL PROYECTO. SE COMPROMISO QUE PRESENTE EL GADP NAPO SE DISEÑAR PROYECTO CON UN ENFOQUE ADECUADO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.</p>			

Elaborado por: Ing. Slendy Cerda

063 700 080 Ext.1028
062 886 503

prefecturaa@napo.gob.ec
jtoapanta@napo.gob.ec

Av. Juan Montalvo
y Olmedo

GAD PROVINCIAL
-NAPO
 Juntos si podemos!
 ADMINISTRACIÓN 2023 - 2027

**Gobierno Autónomo Descentralizado
 Provincial de Napo**
 ADMINISTRACIÓN 2023-2027

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA DE LAS REUNION DE TRABAJO	N°:	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	N°: 6
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA UNIDAD REQUERIENTE	JHON FRUTOS	CARGO	ANALISTA 2
COMUNIDAD/INSTITUCION	GAD PNAPO - DIR. NACIONAL OBRAS Y TURISMO.		
FECHA	21/11/2023		
CELULAR			
PARRQUOIA	TENA		
CANTÓN	TENA		
PROVINCIA	NAPO		
TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO U OBRA	ARR. JHON FRUTOS		
OBJETIVO	SEGUIMIENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 DESARROLLO		

1) REPOSICION DE COMPLETO TURISTICO DE AGUAS TERMALES "SANTA CATALINA" PARALACTA - CANTON QUITO

SEGUIMIENTO: SE ENCUENTRA EN LA DIR. PLANIFICACION PARA PEDIR LA FACTIBILIDAD DEL PROY, ENVIAR A LA DIR. FINANCIERA, LUEGO ENVIAR A LA DIR. ADMINISTRATIVO PARA PEDIR PUBLICACION, ESTE PROY SE ENCUENTRA EN LAS ETAPAS FINALES.

ACUERDOS/COMPROMISOS

EL ARR. JHON FRUTOS SE COMPROMETE A SACAR EL PROYECTO ESTE MES DE NOVIEMBRE.

SE INFORMARA A LA SUBDIRECCION PARTICIPACION CIUDADANA SOBRE EL PROCESO FINAL.

Elaborado por: Ing. Slendy Cerda

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA DE LAS REUNION DE TRABAJO	N°:	SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	N°: 8
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA UNIDAD REQUERIENTE	JOSÉ YANIZ DIEGO PONCE	CARGO	ANALISTA 2
COMUNIDAD/INSTITUCION	GADP NAPO - DIR. OD. PP.		
FECHA	21/11/2023		
CELULAR	0998997020		
PARRQUIA	TENA		
CANTÓN	TENA		
PROVINCIA	NAPO		
TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO U OBRA	ING. DIEGO PONCE - ING. JOSÉ YANIZ		
OBJETIVO	SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023		
DESARROLLO			
<p>1) APERTURA Y CASTRADO DE VIAS DESDE LA COMUNIDAD PITAYACU HASTA LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS ISLA WU RUMU DE 3 Km.</p> <p>SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EL DISEÑO DE UIC, SE ESTARIA ELABORANDO LA DOCUMENTACION PARA EL PERMISO AMBIENTAL, SE CASO DE LA MINA Y USUCA PEDIR LA FACTIBILIDAD EN LA DIR. DE PLANIFICACION</p>			
ACUERDOS/COMPROMISOS			
SE INFORMARÁ A LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL PROCESO FINAL.			

Elaborado por: Ing. Slendy Cerda

063 700 080 Ext.1028
062 886 503

prefecturaa@napo.gob.ec
jtoapanta@napo.gob.ec

Av. Juan Montalvo
y Olmedo

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

Informe Trimestral de Seguimiento y Evaluación de los Proyectos del Presupuesto Participativo 2023

INDICE

Tabla de contenido

1. Introducción.....	3
2. Objetivo.....	3
3. Definiciones	3
4. Metodología.....	5
5. Seguimiento y Evaluación de los Proyectos del Presupuesto Participativo 2023.....	6
5.1 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	13
5.2 SUBDIRECCIÓN DE TALLERES	13
5.3 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN.....	14
5.4 DIRECCIÓN DE NACIONALIDADES Y TURISMO	14
5.5 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.....	14
6. Conclusiones	15
7. Anexos.....	16

1. Introducción

El Seguimiento y Evaluación es un instrumento de gestión de la planificación estratégica que se utiliza para llevar adelante el cumplimiento del Presupuesto Participativo 2023, actividades que están definidas para el cumplimiento y ejecución de los proyectos de cada área con miras a alcanzar los objetivos estratégicos de la institución.

El informe de seguimiento y evaluación del Presupuesto Participativo 2023 se enmarca en el **Art. 16.** de la **Ordenanza que regula la Distribución Económica del Presupuesto Participativo a nivel Territorial de la Provincia de Napo**, donde habla; *El Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Participativo se lo realizará de acuerdo al reporte de los Administradores de cada uno de los proyectos, el proceso estará a cargo de la Subdirección de Participación Ciudadana, quien generará los informes mensuales que servirán como insumo para el cumplimiento de Metas de resultado del PDYOT vigente. Además, para la realización del seguimiento y evaluación del Presupuesto participativo, el/la subdirector/a de Participación Ciudadana designará a un técnico de carrera para realizar los informes mensuales y así existiere continuidad de los mismos.*

El presente documento constituye un instrumento que permite la evaluación periódica de la gestión y, por ende, la toma de decisiones en base a las dificultades y aciertos encontrados en este ejercicio técnico.

Este trabajo se realizó con la información presupuestaria proporcionada por la Dirección Financiera, sustentos técnicos de las otras direcciones, y un cronograma de trabajo que se cumplió desde el 01 de agosto al 17 de octubre de 2023, liderado por la Subdirección de Participación Ciudadana.

El presente documento constituye un instrumento que permite la evaluación periódica de la gestión y, por ende, la toma de decisiones en base a las dificultades y aciertos encontrados en este ejercicio técnico.

2. Objetivo

Informar el avance del seguimiento correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre, mediante la presentación de resultados del seguimiento y evaluación del Presupuesto Participativo 2023

3. Definiciones

Seguimiento: Es una acción para ajustar los detalles o hacer posibles cambios en los planes según las necesidades o las condiciones coyunturales que forma el contexto de implementación del proyecto/programa. El sistema de seguimiento debe ser integrado en el trabajo cotidiano interno coordinado por las personas responsables de las actividades del proyecto.

implementación del proyecto/programa. El sistema de seguimiento debe ser integrado en el trabajo cotidiano interno coordinado por las personas responsables de las actividades del proyecto.

Evaluación: Es una valoración de una acción que ocurre en un momento específico. Se puede evaluar, por ejemplo, hasta qué grado fue ejecutado con eficiencia, o hasta qué grado los objetivos y resultados fueron logrados y/o hasta qué grado el proyecto tuvo impacto en la vida de las personas.

La evaluación muchas veces requiere una visión más amplia y analítica que el propio proyecto, en donde se hace necesario reflexionar sobre el proceso en relación a dificultades y aspectos positivos que pueden afectar de diversa manera el resultado previsto.




La eficiencia: Se la define como la relación que se establece entre el **tiempo**, los **recursos** invertidos y los **logros** obtenidos. Normalmente, se dice que está siendo eficiente cuando se realiza un uso óptimo de los recursos disponibles, y se alcanzan las metas propuestas.

Eficacia: Es la relación que se establece entre las **metas logradas** y programadas, considerando los **tiempos reales** manejados en la ejecución de la acción, proyecto o actividad.

4. Metodología

La Subdirección de Participación Ciudadana, implementa una metodología propia articulada en el **Art. 16. de la Ordenanza que regula la Distribución Económica del Presupuesto Participativo a nivel Territorial de la Provincia de Napo**; se realizan los siguientes pasos:

- a. Se determina el porcentaje de avance que se planteó cumplir en cada uno de los proyectos o actividades, para lo cual se utiliza los rangos según la metodología de Planifica Ecuador, para la evaluación presupuestaria y física.
- b. Se utiliza la cédula presupuestaria de gasto.
- c. Se determina el estado actual del proyecto.
- d. Se determina los nombres de los técnicos responsables de los proyectos.
- e. La evaluación se realiza con los técnicos de cada dirección en fechas establecidas y acordadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	SEMAFORIZACIÓN
• De 71% a 100%	Ejecución óptima 
• De 51% a 70%	Ejecución media 
• De 0% a 49%	Ejecución con problemas 

Fuente: Metodología ex SENPLADES

5. Seguimiento y Evaluación de los Proyectos del Presupuesto Participativo 2023.

OBRAS Y ESTUDIOS

CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023
OBRAS Y ESTUDIOS

CANTONES	N°	GAD PARROQUIALES RURALES	PROYECTOS A EJECUTARSE 2023	INGRESO DE DOC. OFICIALES	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	REC. RESPONSABL	PORCENTAJE DE AVANCE
							Ejecución Óptimo
							Ejecución Media
							Ejecución con problemas

ZONA ALTA

QUIJOS	2	COSANGA	Mantenimiento del puente carrozable sobre el río Alizo, sector Alizo.	Ingreso de oficio N0. 075-GADPRC-2023-P. GADPN-DSG-2023-2658-E.	*Esta en la Dirección de Planificación en revisión del Proyecto oportunamente enviaran a OO.PP	OO.PP: Cesilia Escobar	25%
			Mantenimiento del puente peatonal sobre el río Cosanga, sector Las Orquídeas.	Ingreso de oficio N0. 075-GADPRC-2023-P. GADPN-DSG-2023-3569-E.	*Estan realizando el Informe Técnico para solicitar Topografía	OO.PP: Cesilia Escobar	25%
	2	CUYUJA	Continuación del proyecto Construcción del puente peatonal sobre el río Quijos, sector Huaico - Cuyuja-Cantón Quijos.	Ingreso de oficio N0. 135-2023-GADPRC. GADPN-DSG-2023-3783-E.	*Se esta pidiendo la Factibilidad, Afectación de Predios a la Dirección de Planificación, este proceso esta dondel el Arq. Diego Ramón, oportunamente enviaran a OO.PP	OO.PP: Ing. Leonardo Sanchez	25%
			Estudio y mejoramiento del Recinto Ferial de la Junta Parroquial de Cuyuja - Cantón Quijos.	Ingreso de oficio N0. 137-2023-GADPRC. GADPN-DSG-2023-3784-E.	*Una conversación con la Presidenta de la Junta P. en el tema del Recisto ferial no se tiene elaborado el proyecto ya q menciona que no tienen el técnico para q elabore, esta solicitando q le ayuden con el proyecto a la Junta P. Cotundo para tomar como referencia y elaborar	PRODUCCIÓN: No hay técnico responsable para la ejecución del Proyecto	5%
	1	PAPALLACTA	Repotenciación del Complejo turístico de aguas termales "santa Catalina", Papallacta, Cantón Quijos, provincia de Napo - Etapa 1 y contraparte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Papallacta.	Ingreso de Oficio N0. 194-GADPRP-2023	* La documentación y el proyecto esta ingresado * Aún no envían la documentación y el proyecto al Tec. responsable de la Dirección de Nacionalidades y Turismo. *Hay un problema en el presupuesto del proyecto ya que el valor no consta con lo que tiene la Sub Dirección de Presupuesto.	Nacionalidades y turismo: Ing. Jhon Frutos	5%
	1	SAN FRANCISCO DE BORJA	Elaboración de los estudios pertinente para la construcción de un centro de exposiciones productivas para el GAD Parroquial de San Francisco de Borja - Cantón Quijos.	Ingreso de oficio N0. 048-GADPB-2023. GADPN-DSG-2023-3178-E.	*Se sigue avanzando en la elaboración de los formularios, no se puede iniciar de manera formal ya que se necesita que los predios o los terrenos le entreguen a nombre del Gad Parroquial para poder iniciar la consultoria, se tiene conocimiento q el trámite esta en etapa de ex propiación en la Dirección de Planificación mientras tanto se esta adelantando, la dirección de Planificación envío a Jurídico Memo No. 1259-2023-DP para su	PRODUCCIÓN: Ing. Juan Yumba	20%

CHACO	1	OYACACHI	Construcción de una Planta Procesadora de Truchas para el gad parroquial de Oyacachi, Cantón Chaco	Aún no ingresa el oficio el señor Presidente de la Junta	*La junta parroquial tiene q presentar el proyecto previo acuerdos pero aun no envia a la Dirección correspondiente.	PRODUCCIÓN: No hay técnico responsable para la ejecución del Proyecto		5%
	1	SANTA ROSA	Adquisición Armicos metálicos para el GAD Parroquial Rural de Santa Rosa, cantón El Chaco (\$20.000)		*Solo se ha hecho una inspeccion para verificar los lugares donde se van a colocar	OO.PP: Ing. Jose Lovato		10%
		GONZALO DIAZ DE PINEDA	Cambio de cesped sintético para el Gad. Parroquial de Gonzalo Diaz de Pineda	Acta de Socialización del 12 de octubre 2023	*Esta hecho el proyecto en su totalidad, enviaron a la Dir. De Planificación para elaborar el informe de Factividad, con eso pedirán la certificación presupuestaria a la Dir. Financiera y continuarán con el trámite de contratación. *Además el GadpNapo se hará cargo del 100% del presupuesto asignado del proyecto	OO.PP: Ing. Paulina Rodriguez		20%
			Construcción e Implementación de la Segunda Fase del centro de acopio de parroquia Gonzalo Diaz de Pineda.	Acta de Socialización del 12 de octubre 2023	*No se va a ejecutar el proyecto del centro de acopio y se traslada a la compra de una volqueta transferencia de \$ 40.000			
	1	SARDINAS	Construcción del Puente Peatonal colgante de logitud 47 metros sobre el río Sardinas, en la Parroquia Sardinas, Cantón El Chaco.		*El Proyecto esta en los ultimos procesos solo falta el Manual de Operación y Mantenimiento	Planificación: Ing. David Baquero		25%

ZONA BAJA

TENA	1	PUERTO NAPO	Estudios para la construcción del puente turístico pasarela de la parroquia Puerto Napo, Cantón Tena.	Ingreso de oficio N0. GADPRPN-SG-NG-2023-00302-OF. GADPN-DSG-2023-3776-E. -Memorando No. 1190-2023-DP	*no hay avance por motivos de cambio de nombre del proyecto y otros aspectos tecnicos	Nacionalidades y turismo: Ing. Jhon Frutos		5%
	2		Iluminación y Mantenimiento del puente antiguo sobre el río Napo, parroquia Pto. Napo	Ingreso de oficio N0. GADPRPN-SG-NG-2023-00302-OF. GADPN-DSG-2023-3776-E. -Memorando No. 1190-2023-DP	*no hay avance por motivos de cambio de nombre del proyecto y otros aspectos tecnicos	Nacionalidades y turismo: Ing. Jhon Frutos		5%
	1	PUERTO MISAHUALL	Convenio para operario y combustible hasta diciembre 2023-saldo restante total del presupuesto.	Ingreso de oficio N0. 00107-GADPR-PM-2023. GADPN-DSG-2023-4124-E.	*No consta en POA de OO.PP	OO.PP: No hay técnico responsable para la ejecución del Proyecto		5%
	1	MUYUNA	Construcción del Polideportivo Etapa 1, esto se construirá mediante un convenio tripartito entre Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. Gobierno Municipal de Tena y Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Juan de Muyuna.	Ingreso Oficio No. 017-GADPSIM-2019-2023 de fecha 27 de Junio-2023 de la Junta P.	*Esta en la Dirección de Planificación en revision del Proyecto oportunamente enviaron a OO.PP	Dir. Planificación: Ing. Diego Ramón		25%

ARCHIDONA	1	COTUNDO	Repotenciación y Reconstrucción del Recinto Ferial y Exposiciones "Victor Toapanta" de la Parroquia de Cotundo.	Ingreso Oficio No. 406-GADPRC-2023 de fecha 06 de septiembre-2023 de la Junta P.	*Disposición para Inspección Memorando No. 2832-2023-DFPRD Dir. Producción * Se hizo la visita del lugar * hay un error en el Nombre, en espera de las correcciones. * el predio está a nombre del gad municipal por lo que tocaria ver eso antes de cualquier intervención, además el proyecto se debe realizar bajo los lineamientos de agrocalidad, para lo cual se tendrá una reunión para determinar los puntos	Producción: Hugo Vilema	5%
	1	SAN PABLO	Apertura y lastrado de vías desde la Comunidad Pitayacu hasta la Asociación de Servicios Turísticos Islawn Rummy de 3km, existe el estudio pertinente.	Ingreso Oficio No. 031-PGADPRSPU-2023 de la Junta P. (Cod. 2458-E)	* Se encuentra terminada la Topografía * Falta procesar el levantamiento para hacer plano * El estudio de suelo la Ing. Alejandra León se comprometió entregar el día jueves 12 de octubre	OO.PP: Ing. Diego Ponce	5%

MAQUINARIA.

CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023
OBRAS Y ESTUDIOS

CANTONES	N°	GAD PARROQUIALES RURALES	PROYECTOS A EJECUTARSE 2023	INGRESO DE DOC. OFICIALES	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	REC. RESPONSABL	PORCENTAJE DE AVANCE
							Ejecución Optimo
							Ejecución Media
							Ejecución con problemas

CHACO	GONZALO DÍAZ DE PINEDA	1	compra de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Erick Córdova		40%
	SANTA ROSA	1	adquisición de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Erick Córdova		40%
	LINARES	1	adquisición de un vehículo de capacidad de 6 toneladas para el GAD Parroquial Rural de Linares.	Este proceso se encuentra fuera del POA 2023 de la Dirección de Producción	la Dirección Financiera informa que se tiene la certificación presupuestaria, pero el proceso se encuentra en problemas ya que no existe dentro de POA 2023 de la Dir. de Producción y se sugiere que el DIRECTOR DE Produccion actualice brevemente el POA para que se pueda ejecutar con la compra del vehiculo.	TALLERES: Ing. Christian Pico		20%

ARCHIDONA	COTUNDO	1	compra de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Erick Córdova		40%	
	HATUN SUMACO	1	compra de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Erick Córdova		40%	
	SAN PABLO	1	compra de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Erick Córdova		40%
		1	Adquisición de un camion mediano de 3.7 tonelada	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Desde los Talleres aún no envian los procesos de adquisicion de camionetas, volquetas, maquinaria pesada	TALLERES: Ing. Adres Cabrera		20%	

TENA	PUERTO NAPO	1	Adquisición de una excavadora 320	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Christian Martinez		40%
		1	Adquisición de una volqueta tipo mula	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Erick Córdova		40%
	PUERTO MSAHUALLI	1	Adquisición de una volqueta tipo mula	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Erick Córdova		40%
		1	Adquisición de una Gallineta	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Christian Martinez		40%
	AHUANO	1	Adquisición de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Erick Córdova		40%
		1	Adquisición de excavadora 320	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Christian Martinez		40%
	CHONTA PUNTA	1	Adquisición de excavadora 312	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Christian Martinez		40%
		1	Adquisición de una volqueta tipo mula 12m3	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Erick Córdova		40%
		1	Adquisición de un remolque tipo cama baja	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Desde los Talleres aún no envían los procesos de adquisición de camionetas, volquetas, maquinaria pesada	TALLERES: Ing. Adres Cabrera		20%
	PANO	1	Adquisición de un excavadora 320	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Christian Martinez		40%
	TALAG	1	Adquisición de una excavadora 320	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Miercoles 11 de octubre hubo una reunion con los técnicos llegando a un acuerdo que el día jueves entregan los procesos de la Maquinaria Pesada y Volquetas.	TALLERES: Ing. Christian Martinez		40%

AROSEMENA TOLA	AROSEMENA TOLA	1	Adquisición de una camioneta	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Desde los Talleres aún no envían los procesos de adquisición de camionetas, volquetas, maquinaria pesada	TALLERES: Ing. Adres Cabrera		20%
		1	Adquisición de una forgoneta capacidad 21 pasajeros	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Desde los Talleres aún no envían los procesos de adquisición de camionetas, volquetas, maquinaria pesada	TALLERES: Ing. Adres Cabrera		20%
		1	Adquisición de vehículo tipo camión doble cabina	En proceso de Elaboración de Documentación Habilitante	Desde los Talleres aún no envían los procesos de adquisición de camionetas, volquetas, maquinaria pesada	TALLERES: Ing. Christian Pico		20%

5.1 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	SEMAFORIZACIÓN	
	Eficiencia	Eficacia
De 71% a 100%		
De 51% a 70%		
De 0% a 49%	X	X

Eficiencia avance de los proyectos; 25%, su avance fue con problemas, en cumplimiento de los meses agosto, septiembre y octubre de 2023.

Eficacia avance físico; 0%, su avance fue con problemas, de acuerdo a números de proyectos o actividades planificadas durante los meses agosto, septiembre y octubre de 2023.

5.2 SUBDIRECCIÓN DE TALLERES

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	SEMAFORIZACIÓN	
	Eficiencia	Eficacia
De 71% a 100%		
De 51% a 70%		
De 0% a 49%	X	X

Eficiencia avance de los proyectos; 40%, su avance fue con problemas, en cumplimiento de los meses agosto, septiembre y octubre de 2023.

Eficacia avance físico; 0%, su avance fue con problemas, de acuerdo a números de proyectos o actividades planificadas durante los meses agosto, septiembre y octubre de 2023.

5.3 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	SEMAFORIZACIÓN	
	Eficiencia	Eficacia
De 71% a 100%		
De 51% a 70%		
De 0% a 49%	X	X

Eficiencia avance de los proyectos; 5%, su avance fue con problemas, en cumplimiento de los meses agosto, septiembre y octubre de 2023.

Eficacia avance físico; 0%, su avance fue con problemas, de acuerdo a números de proyectos o actividades planificadas durante los meses agosto, septiembre y octubre de 2023.

5.4 DIRECCIÓN DE NACIONALIDADES Y TURISMO

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	SEMAFORIZACIÓN	
	Eficiencia	Eficacia
De 71% a 100%		
De 51% a 70%		
De 0% a 49%	X	X

Eficiencia avance de los proyectos; 5%, su avance fue con problemas, en cumplimiento de los meses agosto, septiembre y octubre de 2023.

Eficacia avance físico; 0%, su avance fue con problemas, de acuerdo a números de proyectos o actividades planificadas durante los meses agosto, septiembre y octubre de 2023.

5.5 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	SEMAFORIZACIÓN	
	Eficiencia	Eficacia
De 71% a 100%		
De 51% a 70%		
De 0% a 49%	X	X

Eficiencia avance de los proyectos; 25%, su avance fue con problemas, en cumplimiento de los meses agosto, septiembre y octubre de 2023.

Eficacia avance físico; 0%, su avance fue con problemas, de acuerdo a números de proyectos o actividades planificadas durante los meses agosto, septiembre y octubre de 2023.

6. Conclusiones

De acuerdo al seguimiento y evaluación del Presupuesto Participativo 2023 de los meses agosto, septiembre y octubre, se tienen las siguientes conclusiones:


- El informe de seguimiento y evaluación del Presupuesto Participativo 2023 se enmarco en el **Art. 16. de la Ordenanza que regula la Distribución Económica del Presupuesto Participativo a nivel Territorial de la Provincia de Napo**, donde habla; *El Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Participativo se lo realizará de acuerdo al reporte de los Administradores de cada uno de los proyectos, el proceso estará a cargo de la Subdirección de Participación Ciudadana, quien generará los informes mensuales que servirán como insumo para el cumplimiento de Metas de resultado del PDYOT vigente. Además, para la realización del seguimiento y evaluación del Presupuesto participativo, el/la subdirector/a de Participación Ciudadana designará a un técnico de carrera para realizar los informes mensuales y así existiere continuidad de los mismos.*
- En el caso de “Eficiencia” existe factores como el tiempo, no se está cumpliendo con las metas programadas
- En el caso de “Eficacia” no se está cumpliendo con las metas de la ejecución, acción, proyectos o actividades.
- Se debe tomar en cuenta que cada dirección tiene técnicos responsables para la ejecución de los proyectos del Presupuesto Participativos 2023, sin embargo, si uno de los responsables no ha cumplido la planificación, el nivel de cumplimiento recae en toda la dirección.
- Los directores y directoras son los primeros responsables de ejecutar lo planificado por cada una sus direcciones, y son el primer filtro para saber si están caminando o van con retraso. No deben esperar una evaluación mensual. Se recomienda que, si van a plantear alguna modificación, lo hagan con una comunicación oportuna.
- Hace falta por parte de los equipos técnicos una comprensión y cálculo real de lo que significa el proceso de un proyecto P.P , es decir, hay que planificar los que se puedan realizar en el marco de un año y que no dependan de procesos o instituciones externos para su realización, y si así lo fuera, se debe calcular los tiempos que demandan los trámites o entrega de Proyectos, documentos de expropiación, estudios de suelo etc..; ya que al empezar muy tarde el proceso de un proyecto, éste no se va a concluir, precisamente, por empezar su ejecución con retraso.
- Las Juntas Parroquiales también tienen responsabilidad de la mala ejecución de los proyectos, ya que entregan los documentos, proyectos, etc. en destiempo pese a que se ha firmado compromisos.

7. Anexos

- Matriz de Seguimiento y evaluación del P.P 2023
- Cedula Presupuestaria del 30 de septiembre
- Fotos



Fecha: Tena, 23 de octubre de 2023

Elaborado por:	Firma
Tec. Lenin Satama Técnico de Participación Ciudadana	
Mgts. Tholomeo Cortéz Subdirector de Participación C.	
